DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

არქიტექტურული პროექტი
ტიპიური საბავშვო ბაღი

ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი

№4ა

Architectural project
Kindergarten
Poti, 9 april #4a

2020

სარჩევი

სატიტულო ფურცელი	1
სარჩევი, განმარტებითი ბარათი	2
რენდერი	3
საკადასტრო მონაცემები	4
საკადასტრო მონაცემები	5
არსებული ტერიტორიის ფოტოები	6
სიტუაციური გეგმა ორთოფოტოზე	7
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი	8
დაკავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები	9
ტოპოგრაფიული გეგმა	10
სიტუაციური გეგმა	11
ტერიტორიის დაკვალვა	12
გენგეგმა	13
ვერტიკალური გეგმარება	14
ღობე, ჭიშკარი და სარინელი	15
სართულის გეგმა	16
ფასადები	17
ფასადები	18
ფაქტურები რენდერზე	19
ჭრილი	20
იატაკების და კარ-ფანჯრების ტიპები	21
კარ-ფანჯრები	22
ტუალეტის კიხრები	23
სათავსების ტექნოლოგიური სქემა	24
სახურავის გეგმა	25
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	26
სამშენებლო გენგეგმა	27
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	28

განმარტებითი ბარათი

ზოგადი მონაცემები

სამშენებლო მოედანი (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 04.01.10.775) მდებარეობს ქალაქ ფოთში, ნორმების- "სამშენებლო კლიმატოლოგიი"-ს თანახმად სამშენებლო უბნის კლიმატური მახასიათებლებია:

- წლის საშუალო ტემპერატურა + 14.1 °C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი + 41 °C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი - 13 °C
- ნალექის წლიური რაოდენობა -1720მმ
- თოვლის საფარის წონა - 0.5 კპა
- გრუნტის სეზონური ჩაყინვის ნორმატიული სიმაღლე - 0 მ
- ქარის ნორმატიული წნევა 0.6 კპა
- გაბატონებული ქარის მიმართულებაა - აღმოსავლეთი
- სეისმიური დარაიონების რუკის თანახმად ფოთი მიეკუთვნება - 8 ბალიან სეისმიურ ზონას.

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება.

გეგმარება

სამშენებლო მოედანი წარმოადგენს ტრაპეციის ფორმის მიწის ნაკვეთს, რომელიც მთლიანად განთავსებულია საცხოვრებელ უბანში და ესაზღვრება შიდასაუბნო გზები და მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები.

ტერიტორიაზე დგას კაპიტალური ნაგებობები რომლებიც ექვემდებარება დემონტაჟს .

პროექტი ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთზე საბავშვო ბაღის შენობის განთავსებას მთავარი ფასადით სამხრეთით, საუბნო ქუჩის მხარეს, შემოსასვლელები მოეწყობა ამავე მხრიდან. ასევე გათვალისწინებულია ეზოს კეთილმოწყობა-გამწვანება და შემოღობვა.

შენობის გეგმარებითი გადაწყვეტა ითვალისწინებს მასში საბავშვო ბაღის სამი ჯგუფის განთავსებას, ერთ მათგანს ექნება საძინებელი ბლოკი, ხოლო ორს, განკუთვნილს უფროსი ასაკის სკოლამდელთთათვის, ასეთი ბლოკი არ გააჩნია, ამ ჯგუფში სანკვანძებში გოგონების და ბიჭების ტუალეტები განცალკევებულია.

შენობა

პროექტში წარმოდგენილი შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ქვის ნაგებობს, რომლის სართულის იატაკის დონე მიწისპირიდან (სარინელის ჩათვლით) აწეულია საშუალოდ 1.0 მეტრით.

პირველი სართულის იატაკის ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 2.30

შენობის სართულის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე შეადგენს 3.4 მეტრს.

გარე კედლების შვესება შესრულებულია არმირებული წყობით მცირე საკედლე პემზობლოკისგან სისქით 30სმ.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კომბლექსური რკინაბეტონის კარკასი, რკინაბეტონის სვეტების, მონოლითური რკინაბეტონის რიგელებისგან შედგენილი ჩარჩოვანი სტრუქტურა, გარე კედლებზე რკინაბეტონის სვეტების დაბეტონება შესაძლებელია კედლების ამოყვანის პარალელურად.

ტიხრები შესრულებულია არმირებული მცირე საკედლე პემზობლოკის წყობისაგან სისქით 10 სმ.

იატაკები სველ წერტილებში სრულდება მეტლახისაგან, ხოლო ოთახებში ხის ფიცრებისაგან (გემბანური). იატაკის დათბუნება სრულდება XPS ფილებით, ხოლო ჭერის დათბუნება მინაბამბით.

სანკვანძებისა და სამზარეულოს შეკიდული ჭერი ეწყობა პლასტიკატისგან, ხოლო ოთახებში თაბაშირმუყაოსაგან.

სახურავის მზიდი სტრუქტურა ხისაა, ხოლო სახურავის ფენილი შეღებილი მეტალოკერამიტის.

ფანჯრები შესრულებულია მეტალოპლასტმასის პროფილებისგან ორმაგი შემინვით.

შესასვლელი კარები შესრულებულია ფოლადისა და იზოალუმინისაგან, სანკვანძებში მეტალოპლასტმასისაგან, ხოლო ოთახებში ხისაგან (ე. წ. მდფ).

გარე კიბეები და ბაქნები მოპირკეთდება ბაზალტის ფილებით.

შენობის ირგვლივ ეწყობა ბეტონის სარინელი და მისასვლელი ბილიკები.

შენობაში ეწყობა ელმომარაგების, კანალიზაციისა და წყალმომარაგების, ასევე გათბობის შიდა ქსელები რომელთა მიერთებაც მოხდება გარე საუბნო მაგისტრალურ ქსელებთან.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების გათვალისწინებით შენობა მიეკუთვნება III კლასს.

ტერიტორიის ტექნიკური მაჩვენებლები:

ტერიტორიის ფართი - 3235.0 მ^2
განაშენიანების ფართი - 682.2 მ^2
განაშენიანების სიმჭიდროვე - 682.2 მ^2
გამწვანების ფართი - 2550 მ^2
კოეფიციენტი კ1 - 0.2
კოეფიციენტი კ2 - 0.2
კოეფიციენტი კ3 - 0.7

შენობის ტექნიკური მაჩვენებლები:

შენობის სართულიანობა - 1 სართული
შენობის მოცულობა - 4713 მ^3
მათ შორის:
მიწისზედა - 3758 მ^3
მიწისქვედა - 955 მ^3
საერთო ფართი - 627.84 მ^2

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

კ-1-ს კროკი



682.23 m2

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

განმარტებითი ბარათი

Explanatory note

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
2	28

რენდერი

Rendering

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

რენდერი

Rendering

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ა. [illegible]

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
3	28

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: **N 04.01.10.775**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882020219240 - 24/03/2020 13:33:17

მომზადების თარიღი
25/03/2020 19:28:54

საკუთრების განყოფილება

მონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი
ფოთი	ნაბადა-კუნძული		
04	**01**	**10**	**775**

ნაკვეთის საკუთრების გიპი: საკუთრება
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
დაშუკგებული ფართობი: 3235.00 კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი: **04.01.10.175; 04.01.10.706;**
შენობა-ნაგებობის რაობნათვალი: N1, N2, N3

მისამართი: ქალაქი ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი, N 4ა

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882009274944 , თარიღი 07/09/2009 11:31:01
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 08/09/2009

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ძირითადი და დამაგებითი ქონების სახით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება N33 , დამოწმების თარიღი:07/09/2009 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ბრძანება N273 , დამოწმების თარიღი:21/08/2009 , თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია
- ბრძანება N04/434 , დამოწმების თარიღი:16/03/2020 , ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
- ბრძანება N1/1-2544 , დამოწმების თარიღი:07/11/2014 , სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- ბრძანება N765 , დამოწმების თარიღი:13/11/2014 , ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
- წერილი N1-08/1107 , დამოწმების თარიღი:02/06/2016 , ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

მესაკუთრეები:
სსიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, ID ნომერი:215138143

მესაკუთრე: **აღწერა:**
სსიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

იპოთეკა
ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მაგრამ ალარიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეგი ოერეულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემოებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს ოეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალღარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- ლოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიგორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში გვქონაური სარვეების აღმოჩენის შემთხვევაში დაგეიკავშიროთ: 2 405405 ან პირადად შეიტანეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგეიკავშიროთ ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: info@napr.gov.ge

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:
საქართველო, ფოთი

Project address:
Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი
Stage: Architectural project

საკადასტრო მონაცემები

Land cadastre

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
4	28

საკადასტრო მონაცემები

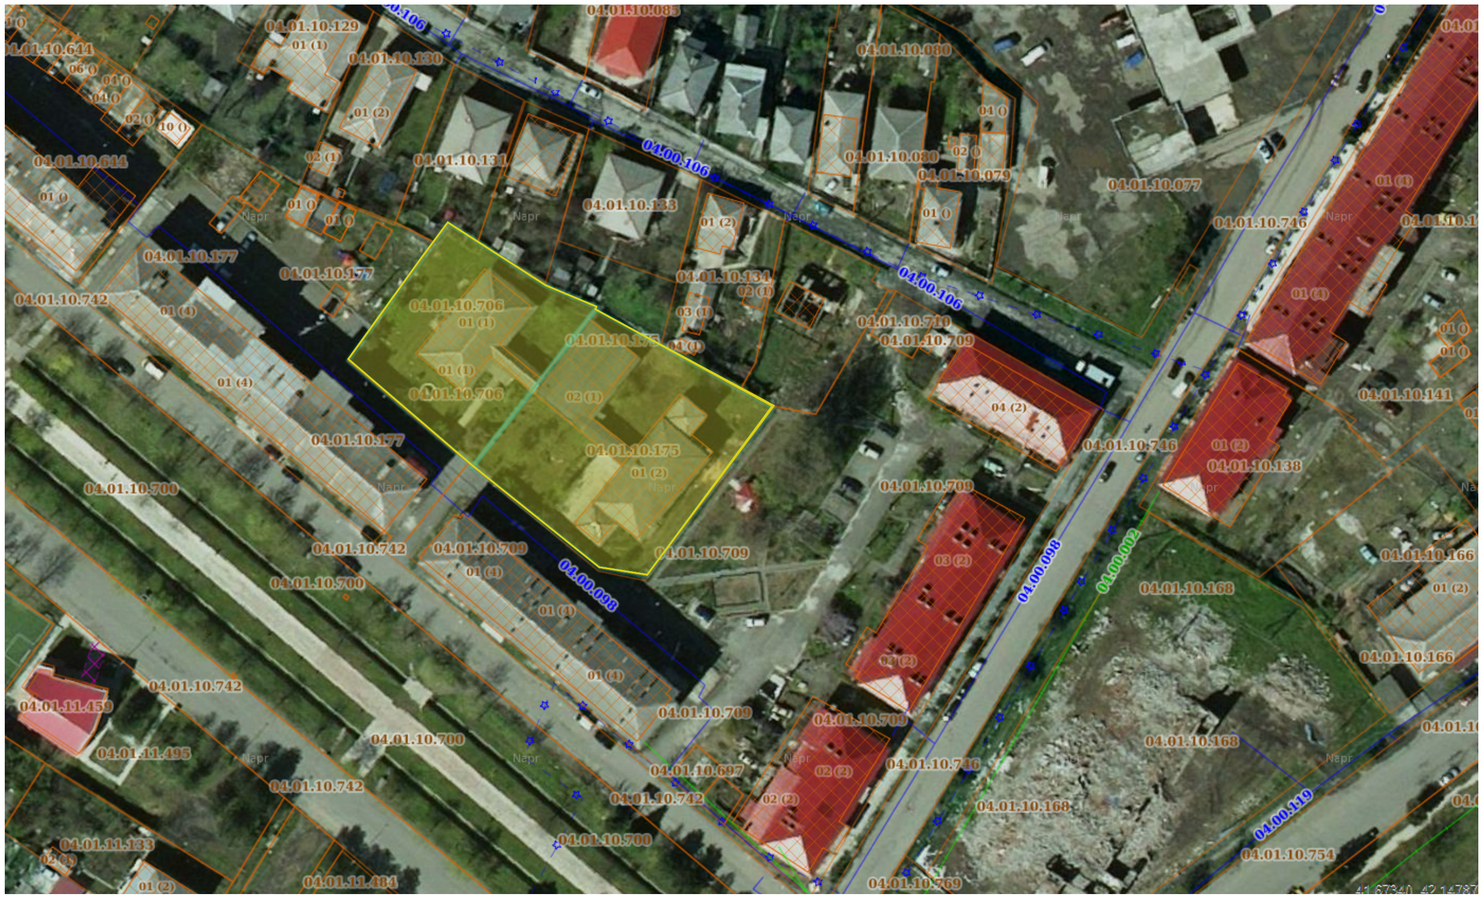

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი:	**04.01.10.775**	ნაკვეთის დანიშნულება:	**არასასოფლო სამეურნეო**
განცხადების ნომერი:	**882020209310**	ფართობი:	**3237 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)** **3235 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 37N)**
მომზადების თარიღი:	**19/03/2020**		

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური სახლი
ბალი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

საკადასტრო მონაცემები

Land cadastre

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
5	28

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი: მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

არსებული
ტერიტორიის
ფოტოები

Existing photos

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
6	28

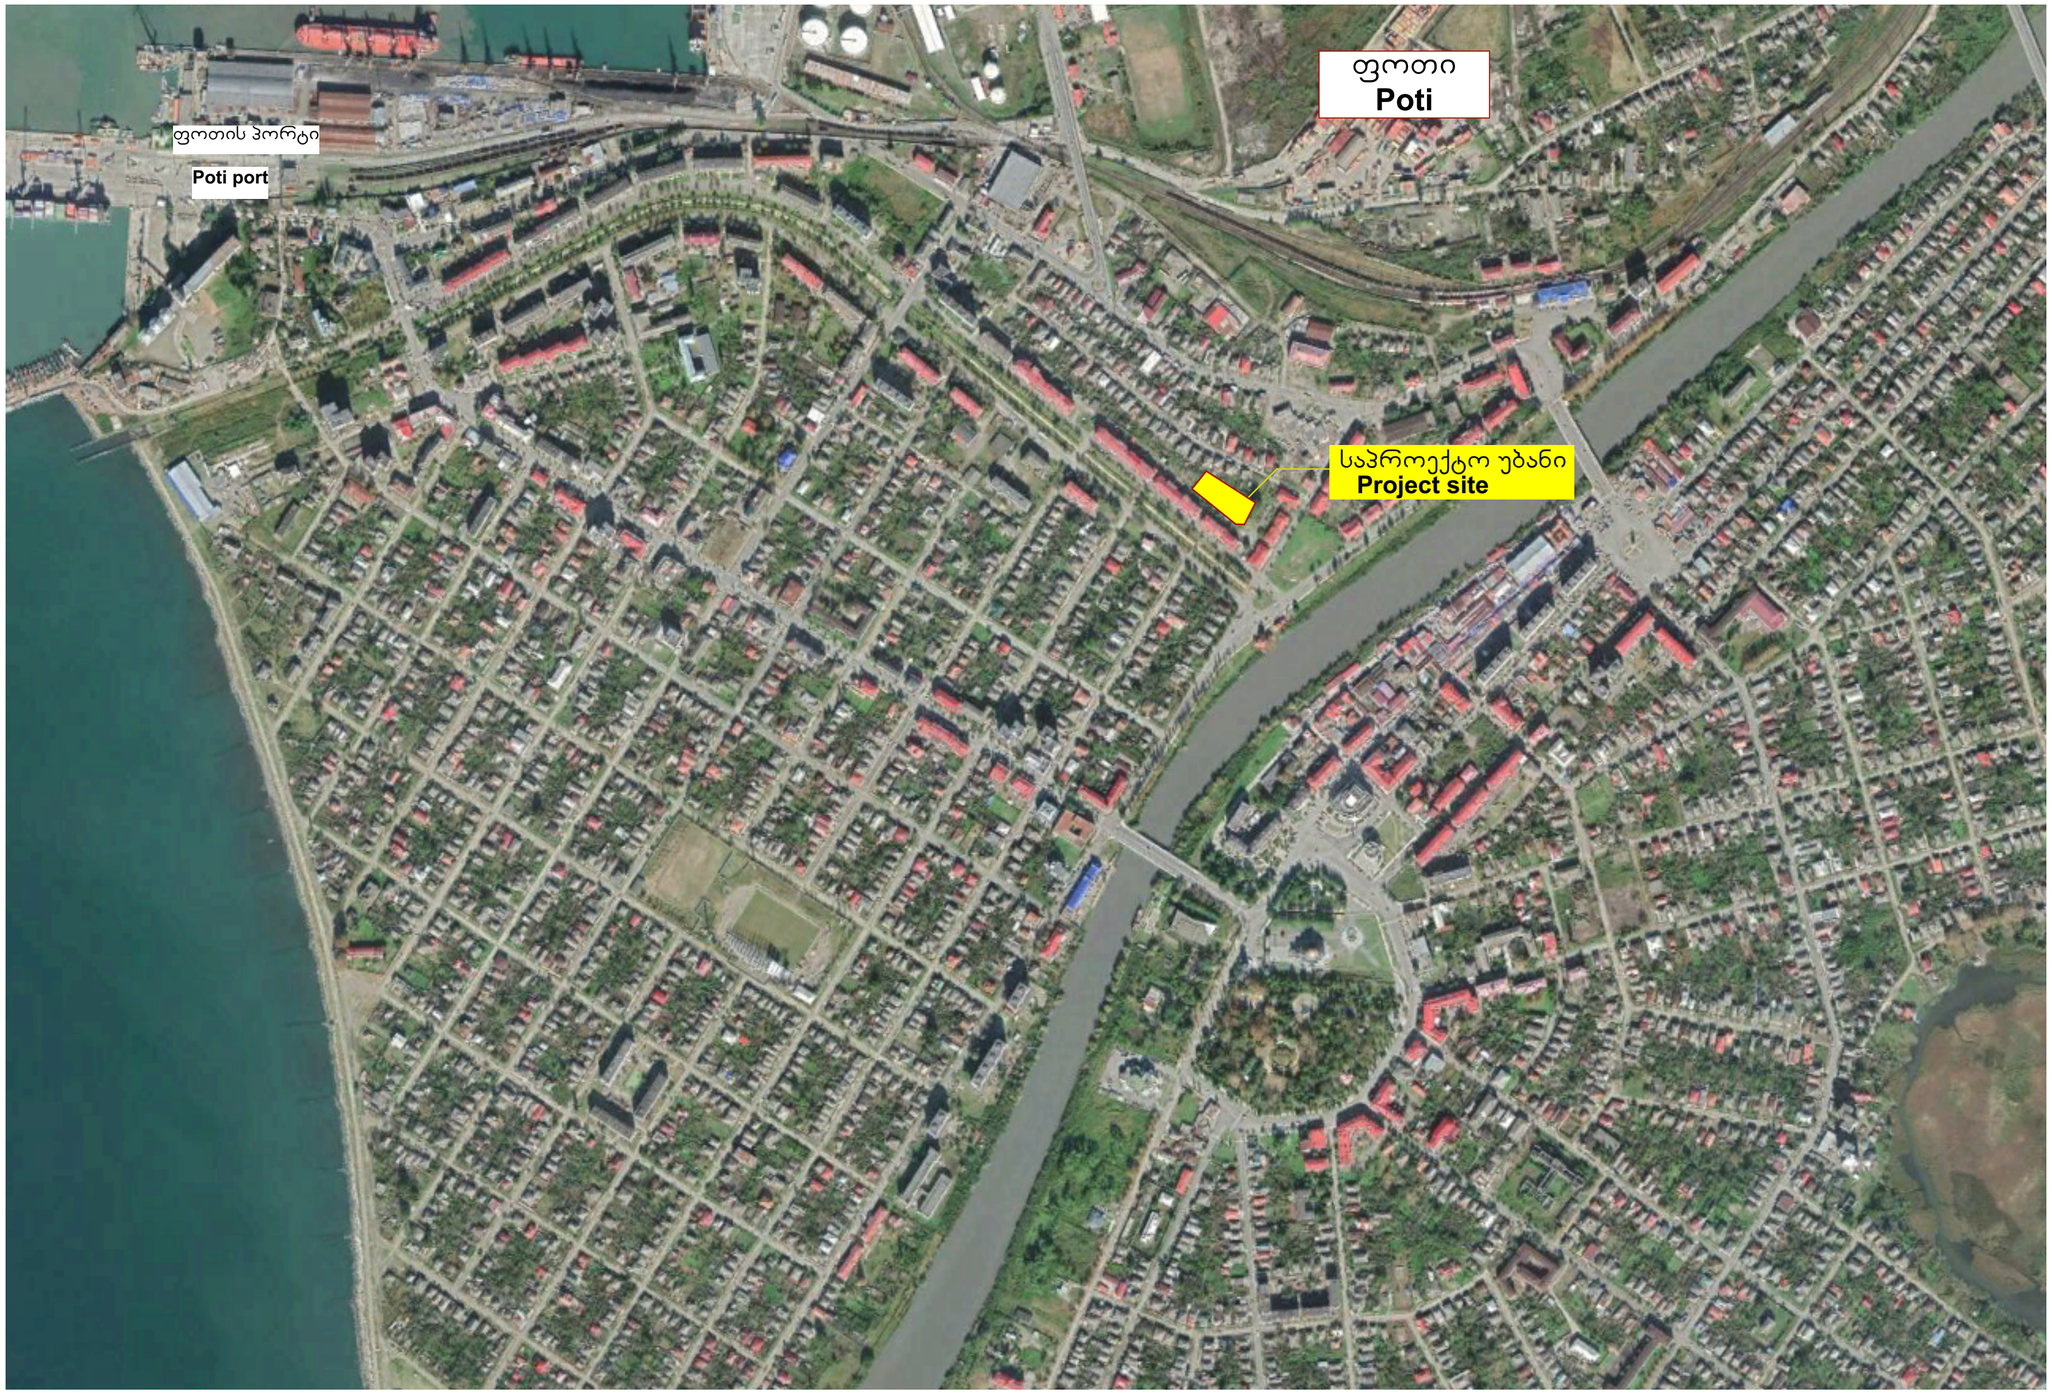

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

სიტუაციური გეგმა ორთოფოტოზე

Situational plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
7	28

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (150 წუთი)
- საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ
- საქმიანი ჯგუფი სქ
- თავშეყრის ჯგუფი თვ-2
- თავშეყრის ჯგუფი თვ-3
- სასაწყობე ჯგუფი სწ-2
- ბეტონის ბლოკის წყობა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- გასასვლელი ფირნიში

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები
საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ
საქმიანი ჯგუფი სქ
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2
თავშეყრის ჯგუფი თვ-3
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2

კონსტრუქციის ტიპი	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის	V-

სიმაღლის შეზღუდვები		
დაკავებულობები	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
1. საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ	1 სართული	1 სართული
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	2 სართული	
3. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	1 სართული	
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	1 სართული	
5. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	2 სართული	
საერთო სიმაღლე	12.2	8.00
მიწის ზემოთ სართულების რაოდენობა		I სართული

ფართობის შეზღუდვები				
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი		
1. საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ	880	115.46 მ²		
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	840	24.66 მ²		
3. თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	560	169.9 მ²		
4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3	560	69.62 მ²		
5. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	1250	68.63 მ²		
იატაკის საერთო ფართობი	627.8 მ²			
იატაკების რაოდენობა	მიწის დონის ზედა 1			
შენობის საერთო ფართობი	669.3 მ²			

გარე კედლის ღიობისადმი მოთხოვნები					
გარეთა კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი	კედლის ღიობის ფართობი			
		დასაშვები		გათვალისწინებული	
		დაცული	დაუცველი	დაცული	დაუცველი
ღერძი 1-8	25.7 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		28 %
ღერძი A-E	5 მ.	75%	25%		14 %
ღერძი 8-1	27.7 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		20 %
ღერძი E-A	11.2 მ.	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია		15 %

ხანძრისგან დაცვის სისტემისადმი მოთხოვნები		
გათვალისწინებულია თუ არა ავტოსაშხეფი სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა სახანძრო მილდგარების სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა კვამლის საკონტროლო სისტემა		არა
გათვალისწინებულია თუ არა ხელის ცეცხლმაქრები	კი	
გათვალისწინებულია თუ არა სახანძრო განგაშის სისტემა	კი	
საევაკუაციო განათების მოწყობა	კი	

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ-სთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე საქმიანი ჯგუფი სქ-სთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	0.90

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე თავშეყრის ჯგუფი თვ-2-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე თავშეყრის ჯგუფი თვ-3-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	2			0.82	1.50

გასასვლელების რაოდენობა და სიგანე სასაწყობე ჯგუფი სწ-2-ისთვის						
სართულები	გასასვლელების რაოდენობა		გასასვლელის სიგანე			
			კიბეები		სხვა კომპონენტები	
	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I სართული	1	1			0.82	1.00

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა						
დაკავებულობის დატვირთვის გამოთვლა						
ფიქსირებული მოწყობილობა	მოთხოვნილი			გათვალისწინებული		
	I	II	III	I	II	III
უნიტაზი	12			15		
ტუალეტის ხელსაბანი	12			16		
აბაზანა/საშხაპე	2			2		
სასმელი წყლის ფანტანი	-			-		
სამომხახურეო ნიჟარა	1			3		

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
8	28

დაჯავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური სამკვიდრო ბლოკი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

დაჯავებულობების დატვირთვა, ხელმისაწვდომობა და გასასვლელები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
9	28

ტოპოგრაფიული გეგმა

Topographic plan

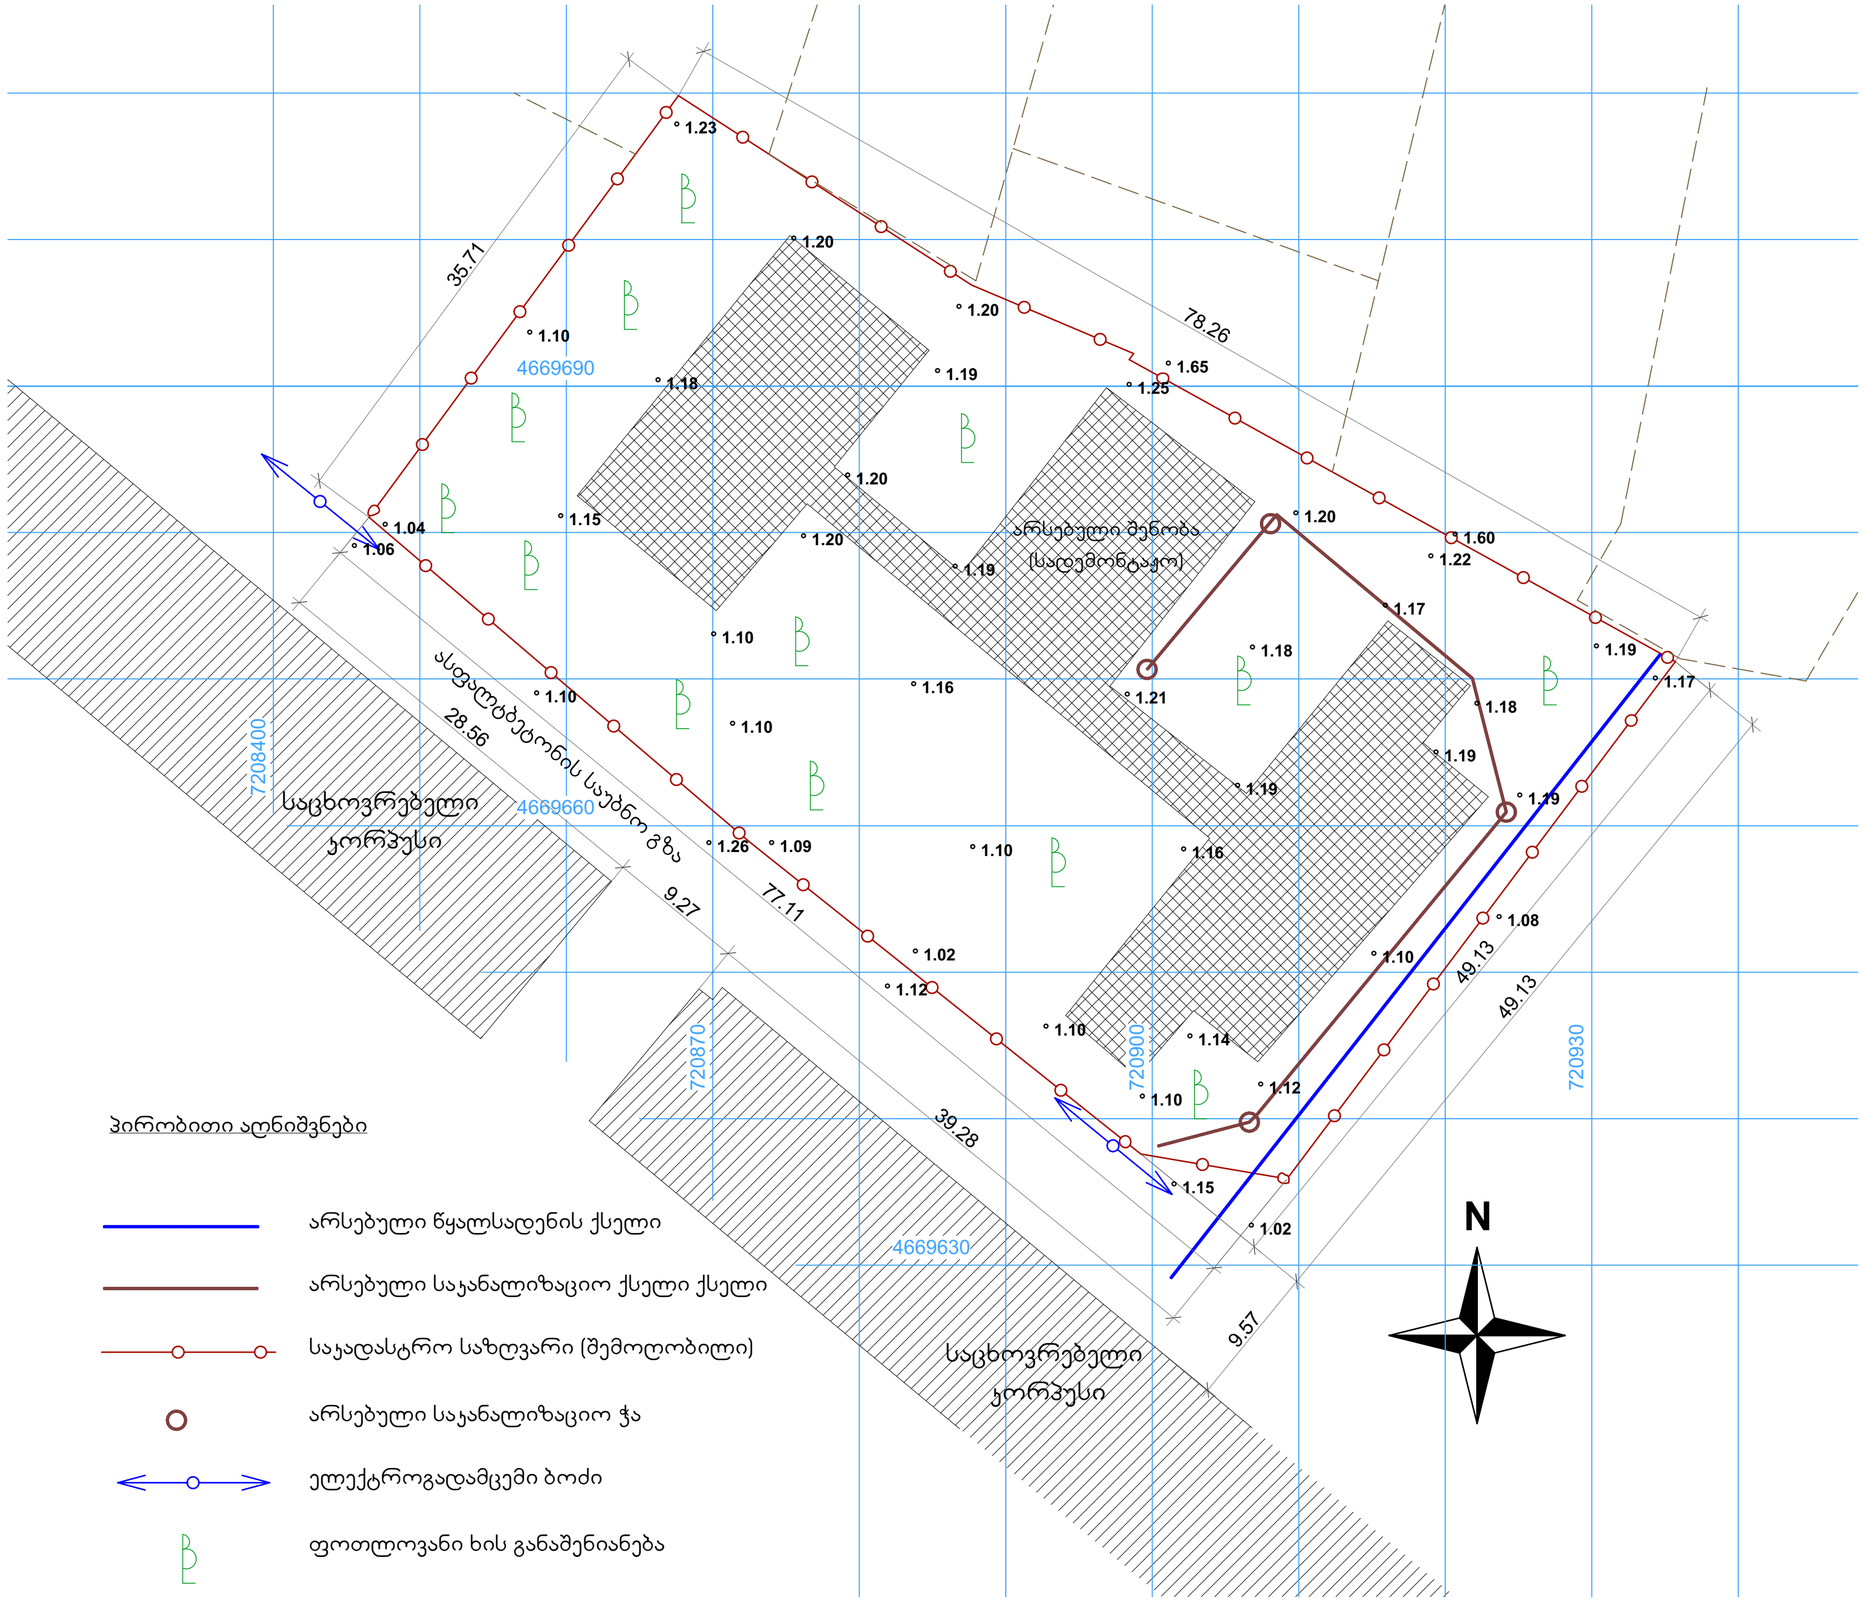

პირობითი აღნიშვნები

- არსებული წყალსადენის ქსელი
- არსებული საკანალიზაციო ქსელი ქსელი
- საკადასტრო საზღვარი (შემოღობილი)
- არსებული საკანალიზაციო ჭა
- ელექტროგადამცემი ბოძი
- ფოთლოვანი ხის განაშენიანება

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ტოპოგრაფიული გეგმა

Topographic plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
10	28

სიტუაციური გეგმა

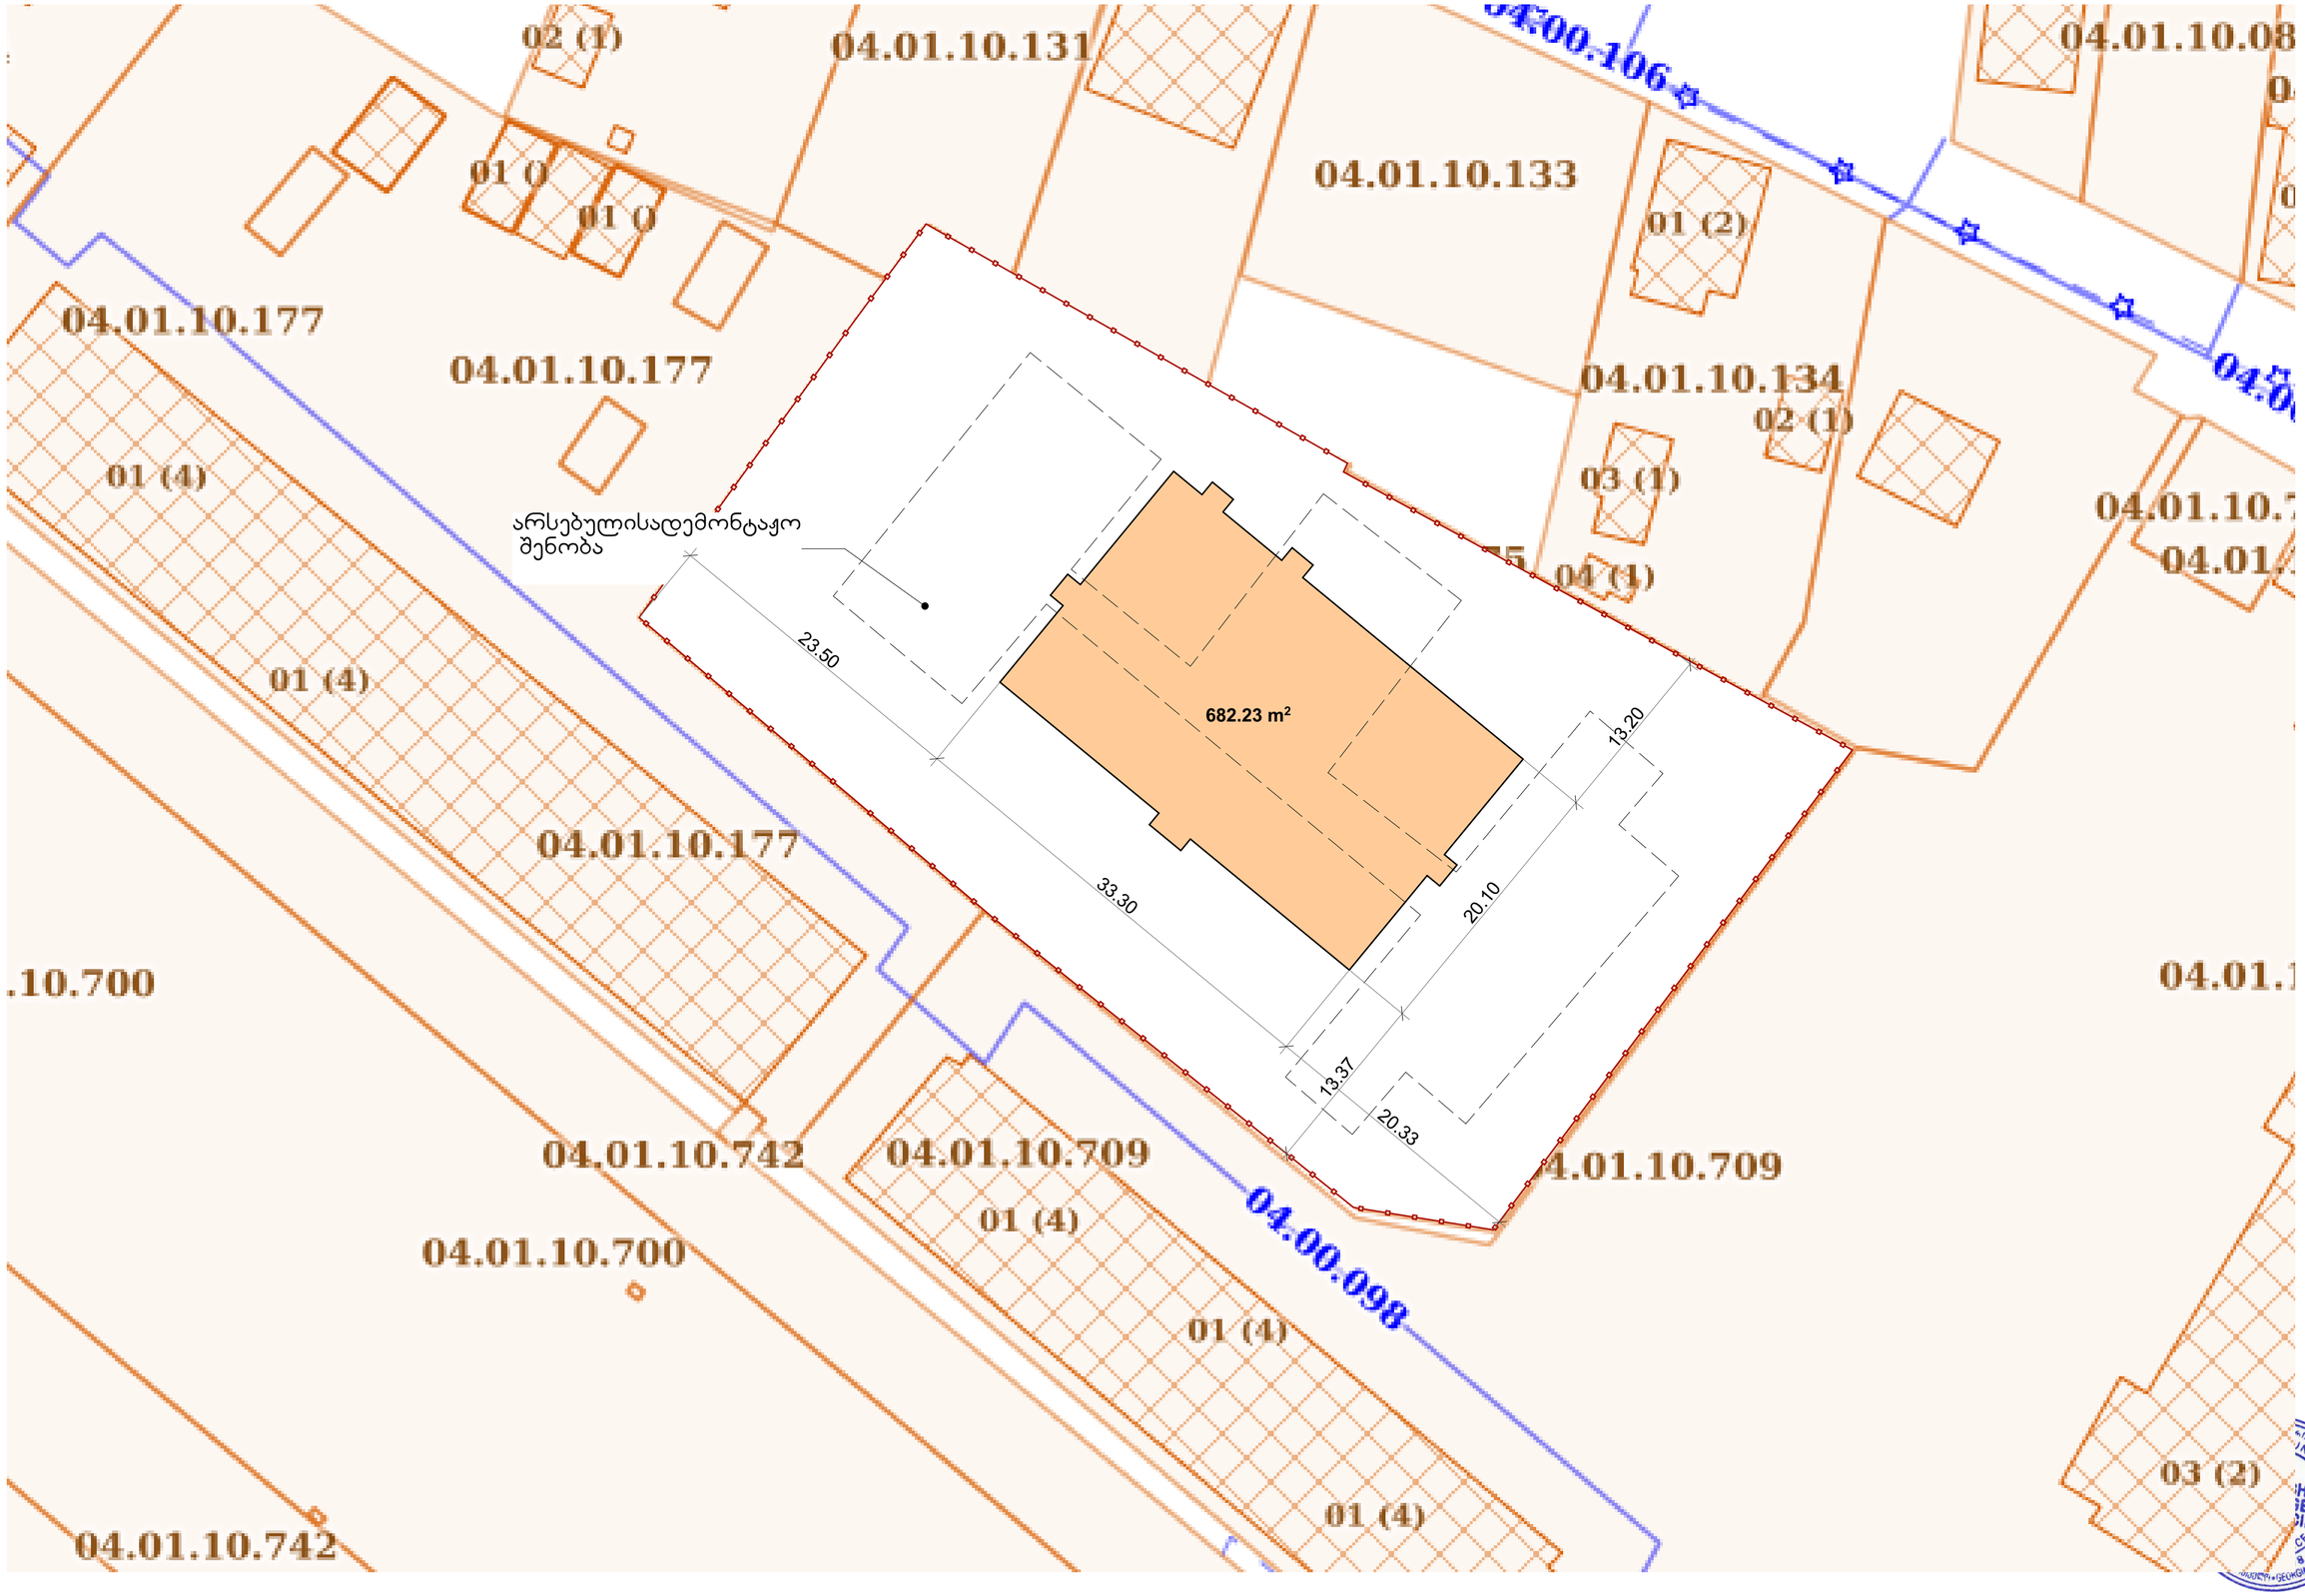

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სიტუაციური გეგმა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
11	28

ტერიტორიის დაკვალვა

Territory marking

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ტერიტორიის დაკვალვა

Territory marking

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
12	28

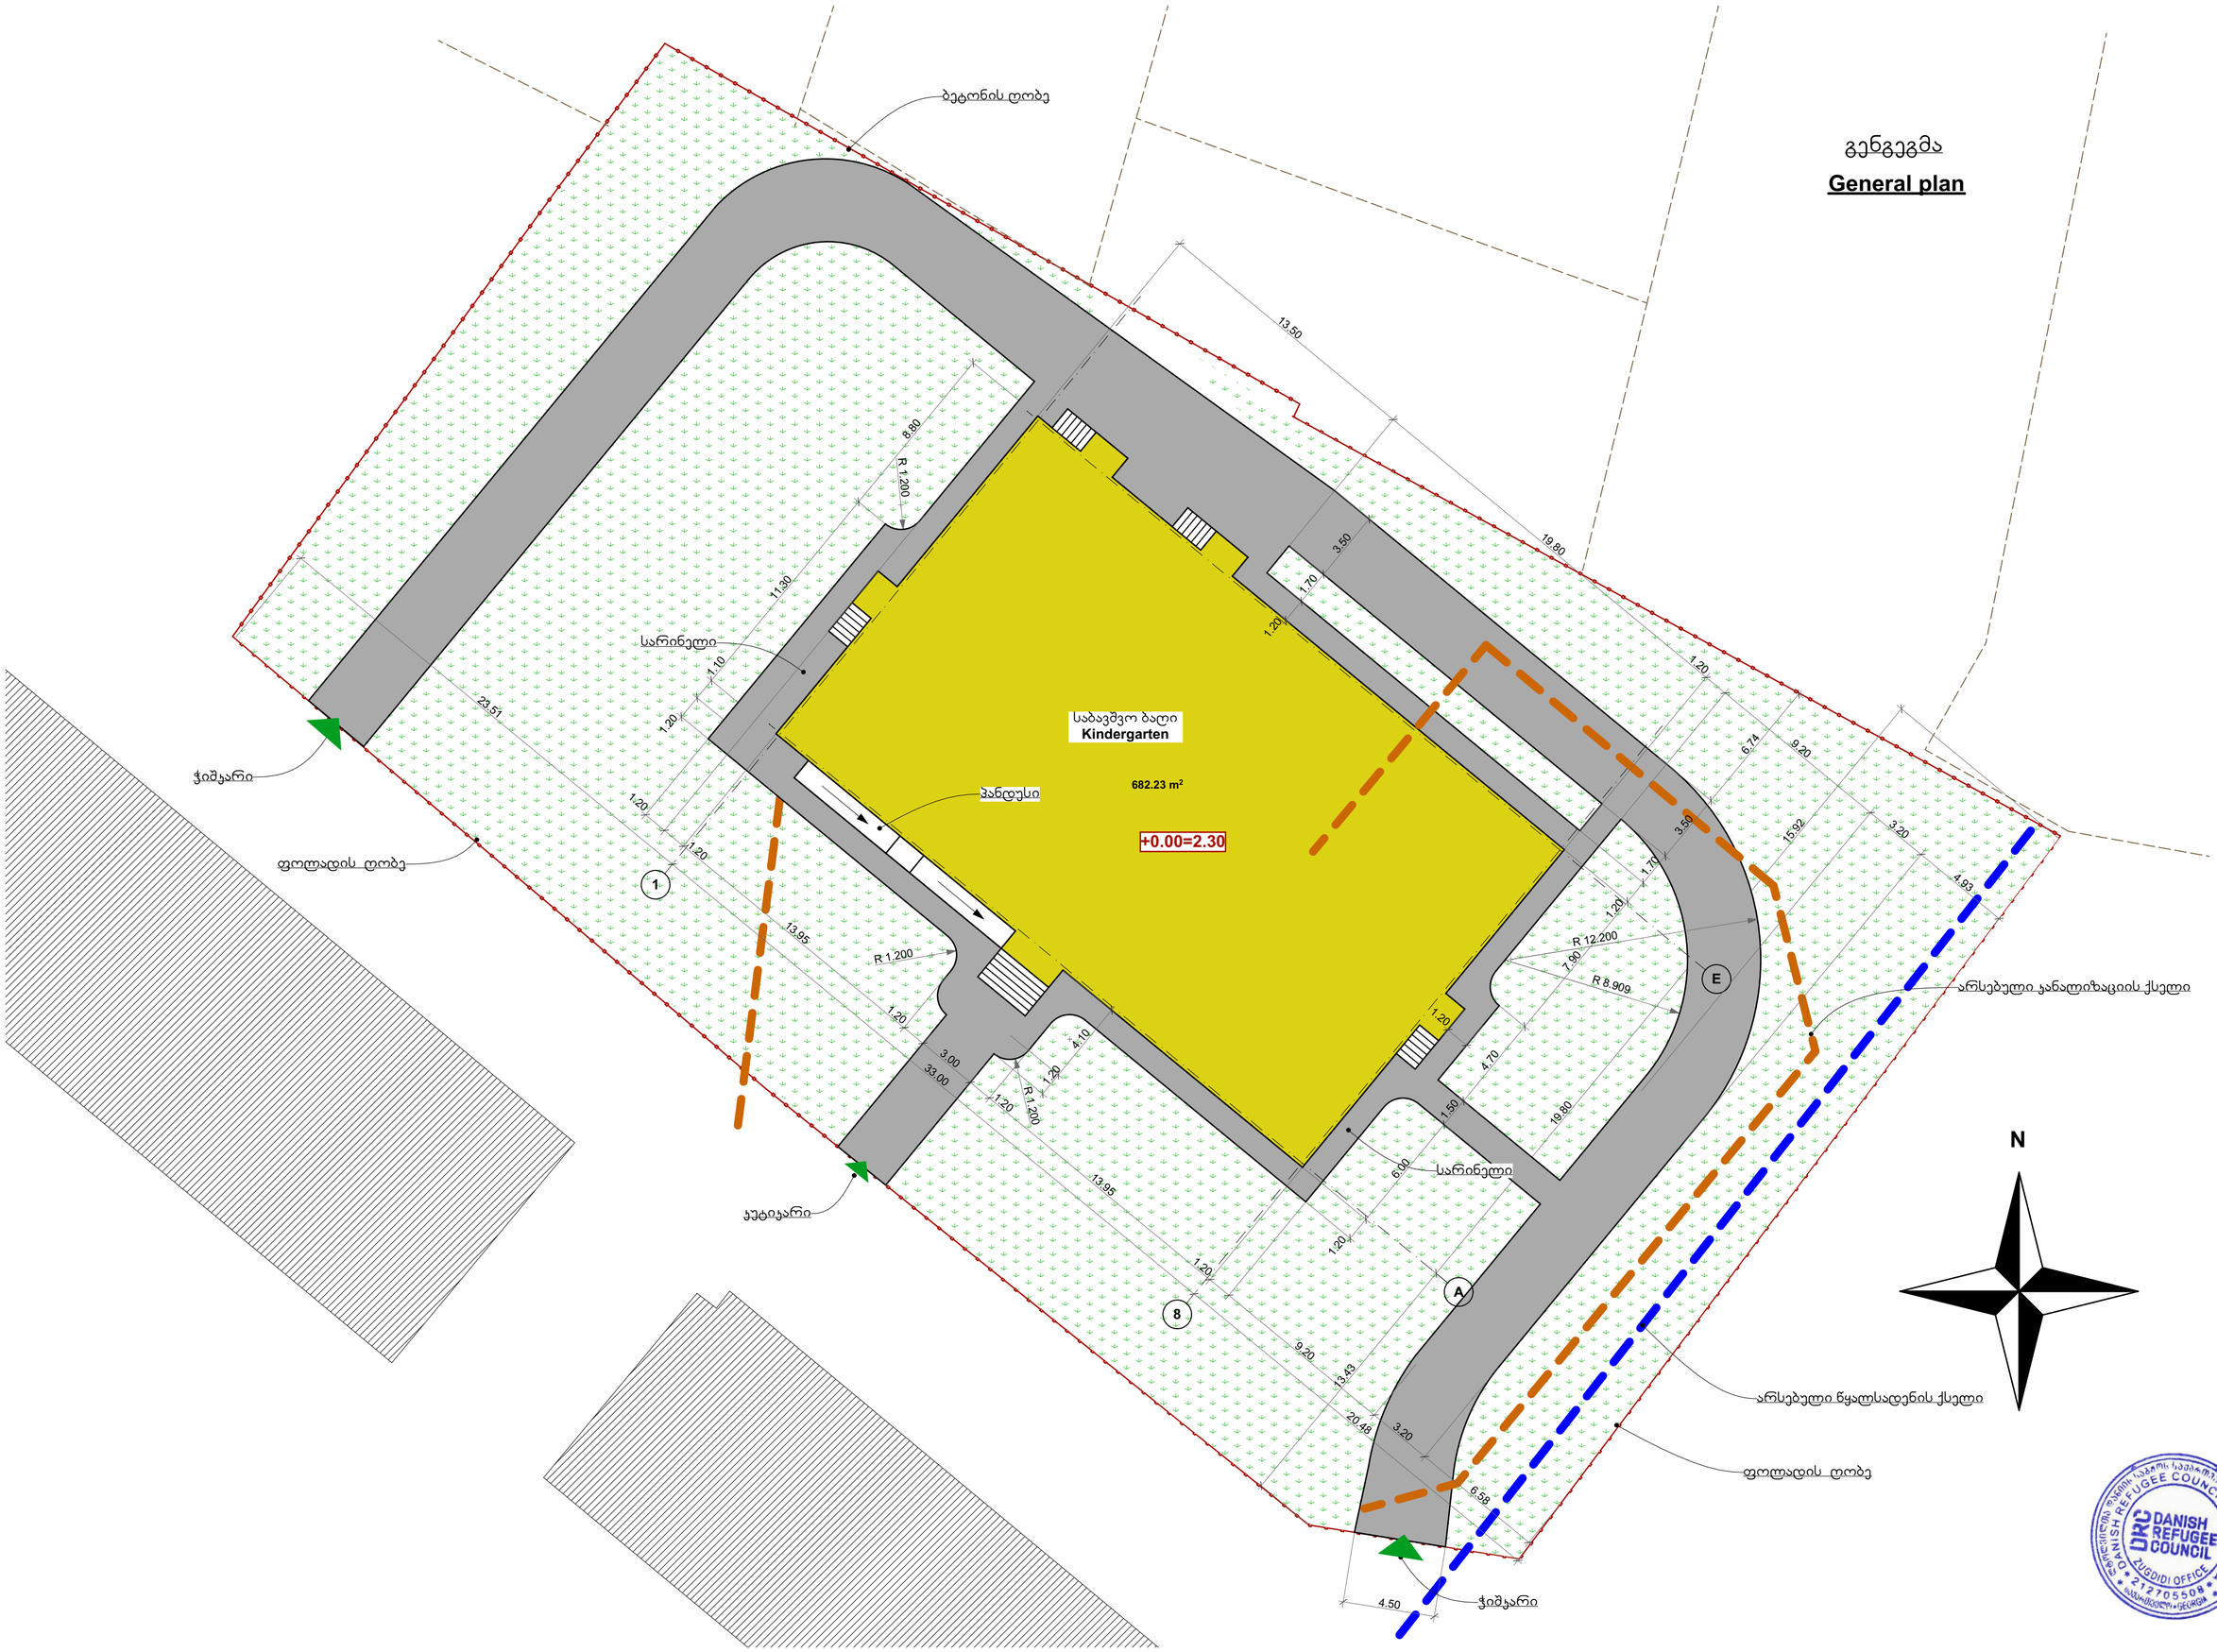

გენგეგმა

General plan

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

ა-1-ს პროექი

682.23 m2

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

N

გენგეგმა
General plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
13	28

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ვერტიკალური გეგმარება

Vertical layout

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
14	28

ღობის პოლიგონი

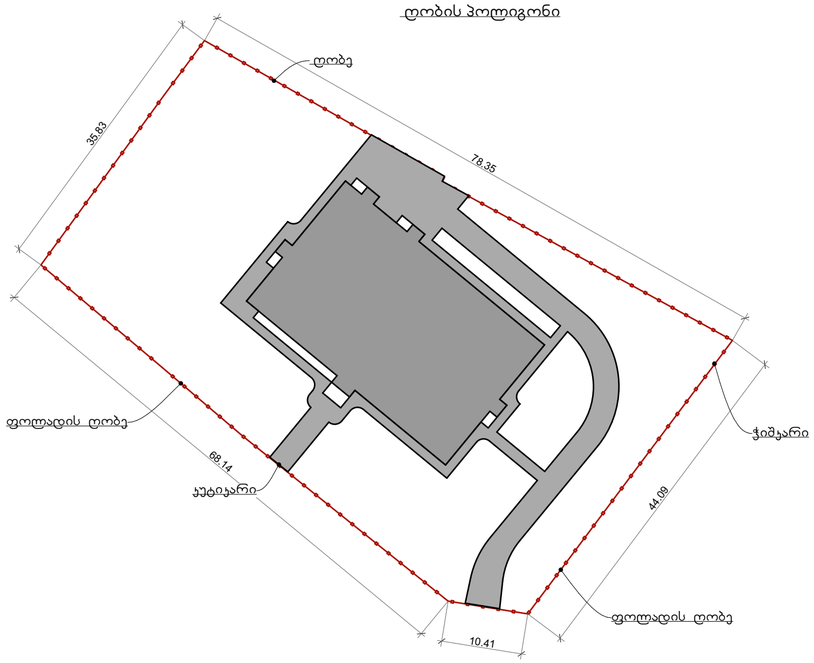

ჭიშჯარი

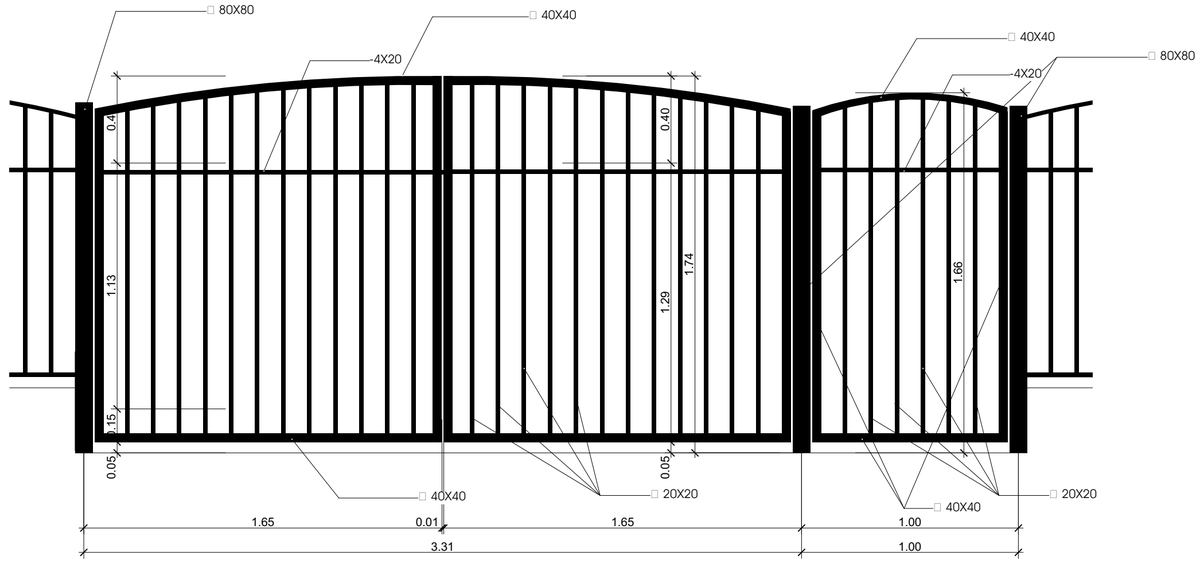

ღობის სექცია

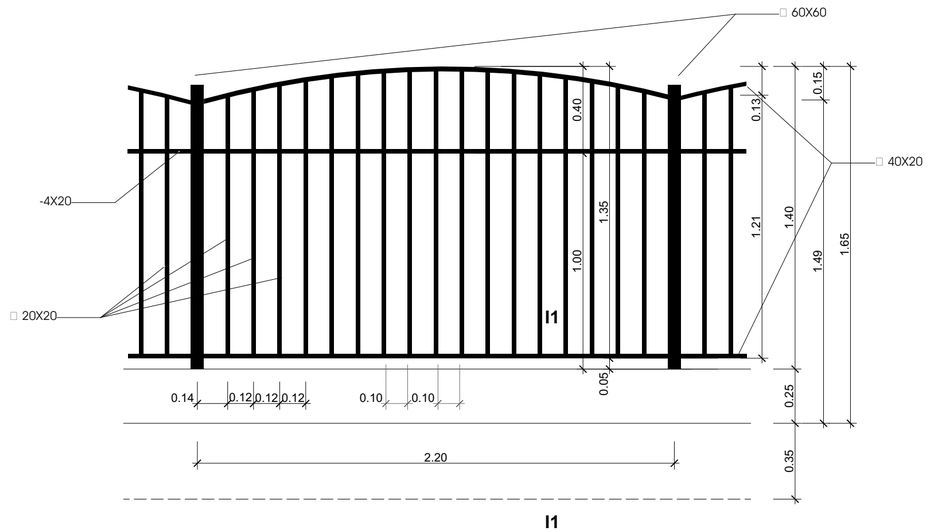

ჯუტიჯარი

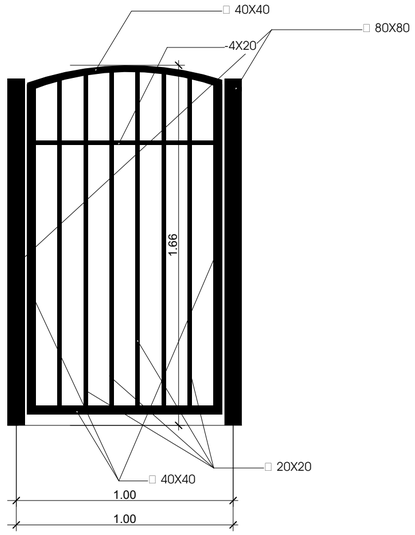

ჭრილი 1-1

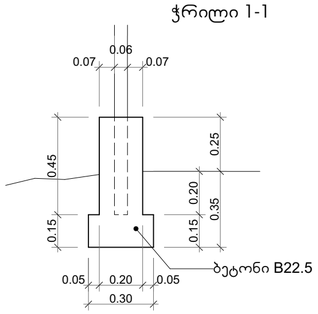

სარინელის პონსტრუქცია



რკინაბეტონის პანელური ღობე

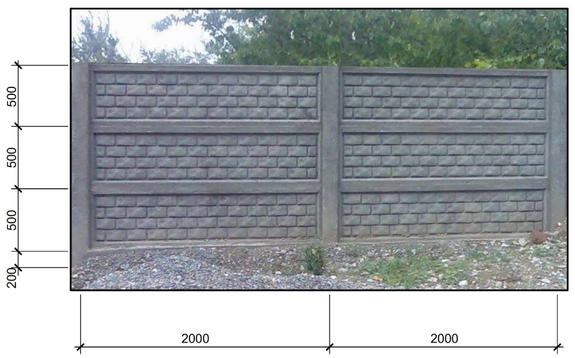

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:
საქართველო, ფოთი

Project address:
Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ღობე, ჭიშჯარი და სარინელი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
15	28

DANISH REFUGEE COUNCIL ZUGDIDI OFFICE 211705508 საქართველო GEORGIA

1.	ჯგუფის ოთახი	52.51 m2	1. Group room
2.	საძინებელი	51.03 m2	2. Bedroom
3.	გასახდელი	17.7 m2	3. Wardrobe
4.	სანკვანძი	15.73 m2	4. WC
5.	ბუფეტი	3.98 m2	5. Buffet
6.	ჯგუფის ოთახი	50.45 m2	6. Group room
7.	გასახდელი	17.7 m2	7. Wardrobe
8.	სანკვანძი	3.99 m2	8. WC
9.	სანკვანძი	4.86 m2	9. WC
10.	სანკვანძი	4.86 m2	10. WC
11.	ბუფეტი	4.05 m2	11. Buffet
12.	ჯგუფის ოთახი	52.52 m2	12. Group room
13.	გასახდელი	17.72 m2	13. Wardrobe
14.	სანკვანძი	4.35 m2	14. WC
15.	სანკვანძი ბიჭების	5 m2	15. WC
16.	სანკვანძი გოგონების	5.16 m2	16. WC
17.	ბუფეტი	3.84 m2	17. Buffet
18.	ბაღის დირექტორი	12.6 m2	18. Manager
19.	მეთოდური კაბინეტი	10.92 m2	19. Staff room
20.	პერსონალის ოთახი	7.42 m2	20. Staff room
21.	სანკვანძი	2.1 m2	21. WC
22.	სანკვანძი	2.1 m2	22. WC
23.	საკუჭნაო	8.06 m2	23. Store
24.	ექიმის ოთახი	11.45 m2	24. Medical office
25.	სანკვანძი	1.62 m2	25. WC
26.	სანკვანძი მშმ პირთათვის	4.5 m2	26. WC
27.	გასახდელი სანკვანძით	7.59 m2	27. Staff wardrobe
28.	საკონცერტო დარბაზი	69.62 m2	28. Concert hall
29.	ჰოლი დერეფნით	72.42 m2	29. Hall with corridor
30.	აივანი	26.1 m2	30. Balcony
31.	სამზარეულო	19.33 m2	31. Kitchen
32.	საკვების გაცემის ზონა	5.04 m2	32. Distribution room
33.	სამზარეულოს სამრეცხაო	12.8 m2	33. Washing of kitchen
34.	მმრალი პროდუქტის სანყობი	3.67 m2	34. Dry food warehouse
35.	ბოსტნეულის სანყობი	3.15 m2	35. Vegetable warehouse
36.	სამრეცხაო-საუთოებელი	10.14 m2	36. Washing and Ironing room
37.	სუფთა თეთრეულის სანყობი	4.08 m2	37. Clean laundry warehouse
38.	საქვაბე მეურნეობა	4.78 m2	38. Boiler room
39.	ეიბის ბაქანი	3.3 m2	39. Stairway
40.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	40. Stairway
41.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	41. Stairway
42.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	42. Stairway
43.	ეიბის ბაქანი	2.4 m2	43. Stairway
44.	პანდუსი		44. Pandus
	საერთო ფართი	627.84 m2	Total area

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სართულის გეგმა

Floor plan

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
16	28

ფასადი 1-8

ფასადი 8-1

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა



პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი: მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფასადები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
17	28

ფასადი **E-A**

ფასადი **A-E**

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა



პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფასადები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
18	28

ფაქტურები რენდერზე

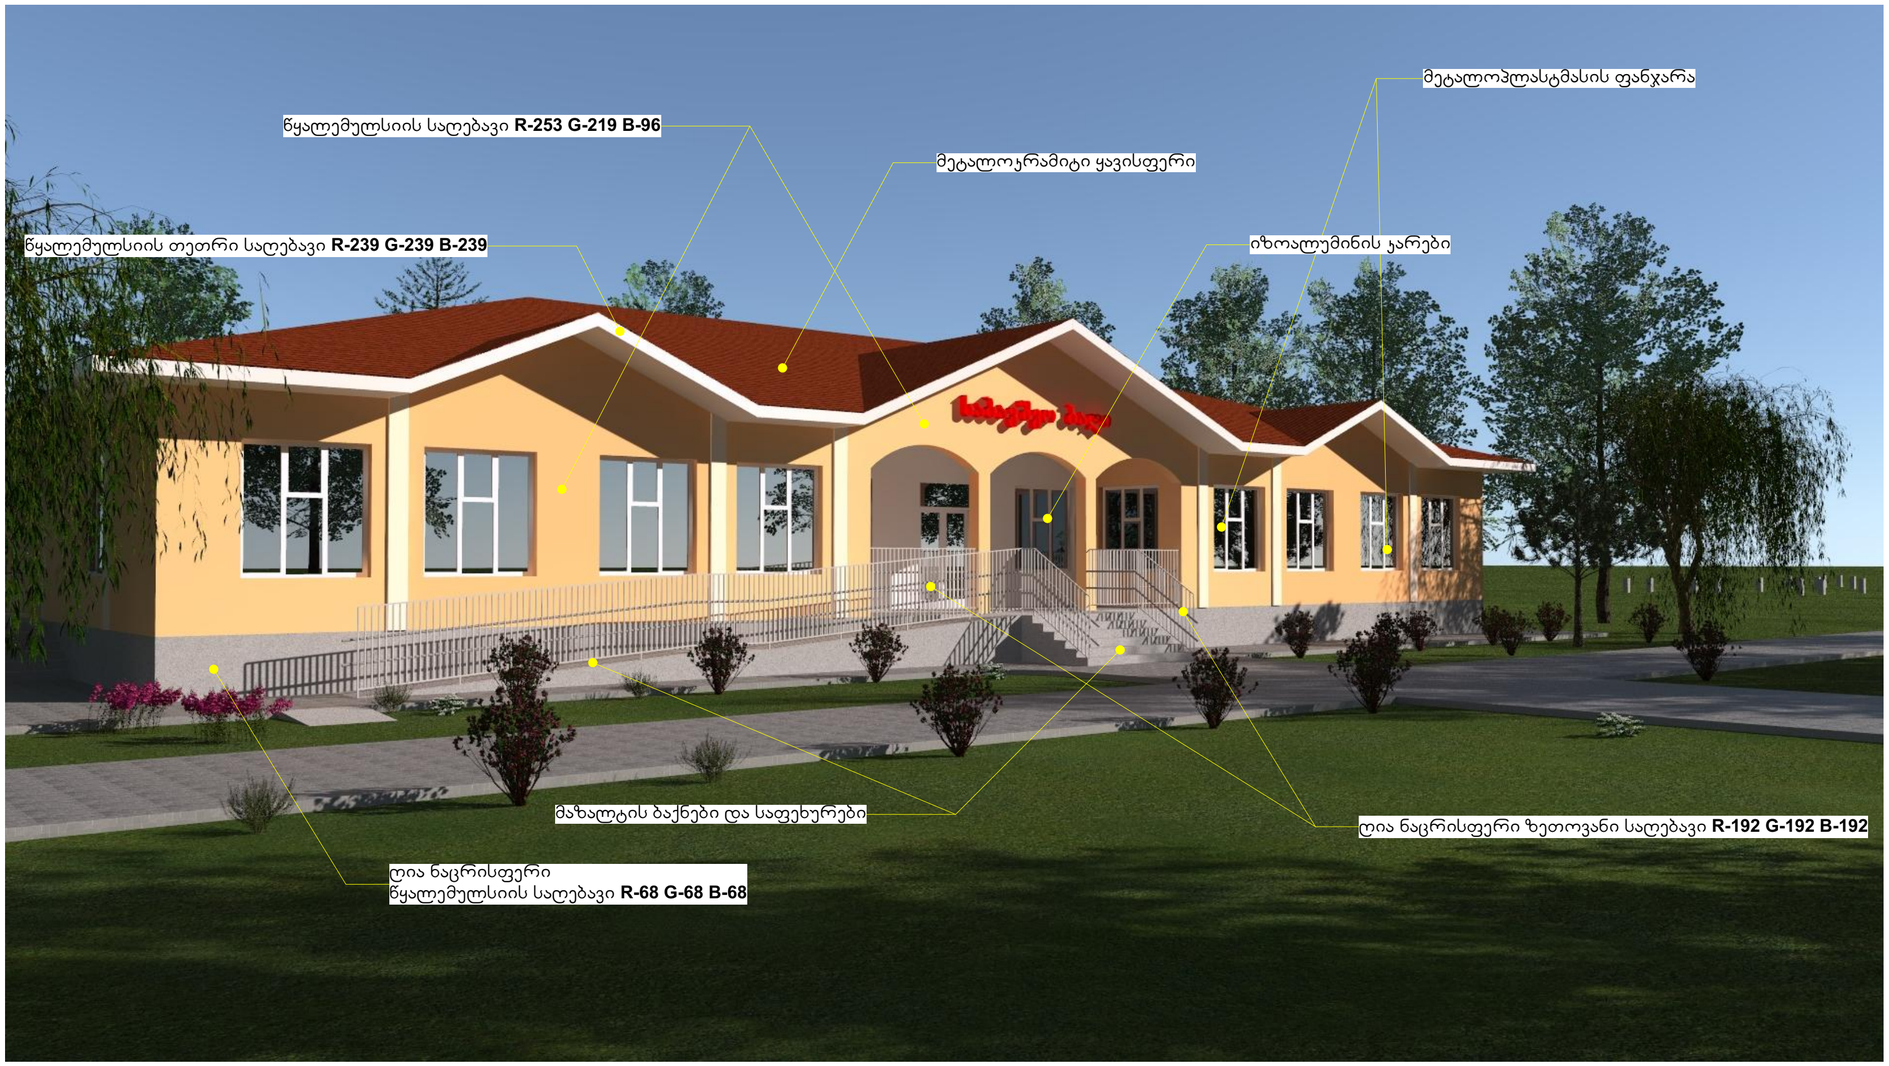

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

ფაქტურები
რენდერზე

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
19	28

ჭრილი **A-A**

ჭრილი **B-B**

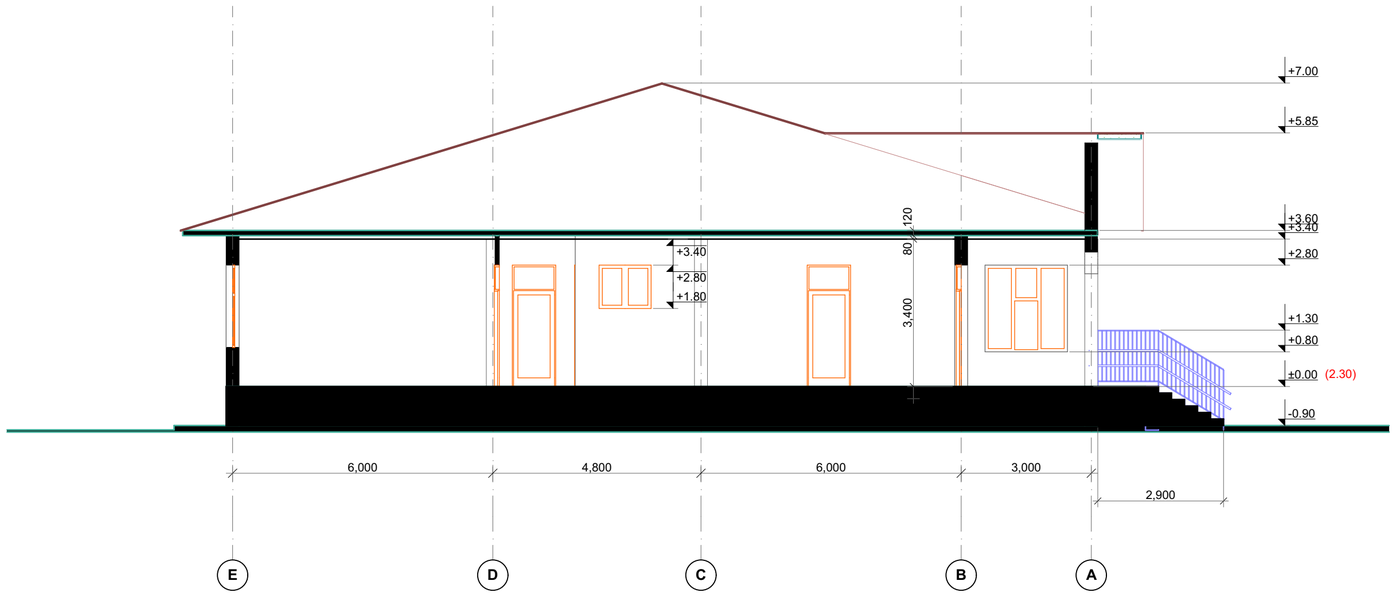

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა



პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

ჭრილი **A-A**
ჭრილი **B-B**

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
20	28

იატაკების და კარ-ფანჯრების ტიპები გეგმაზე

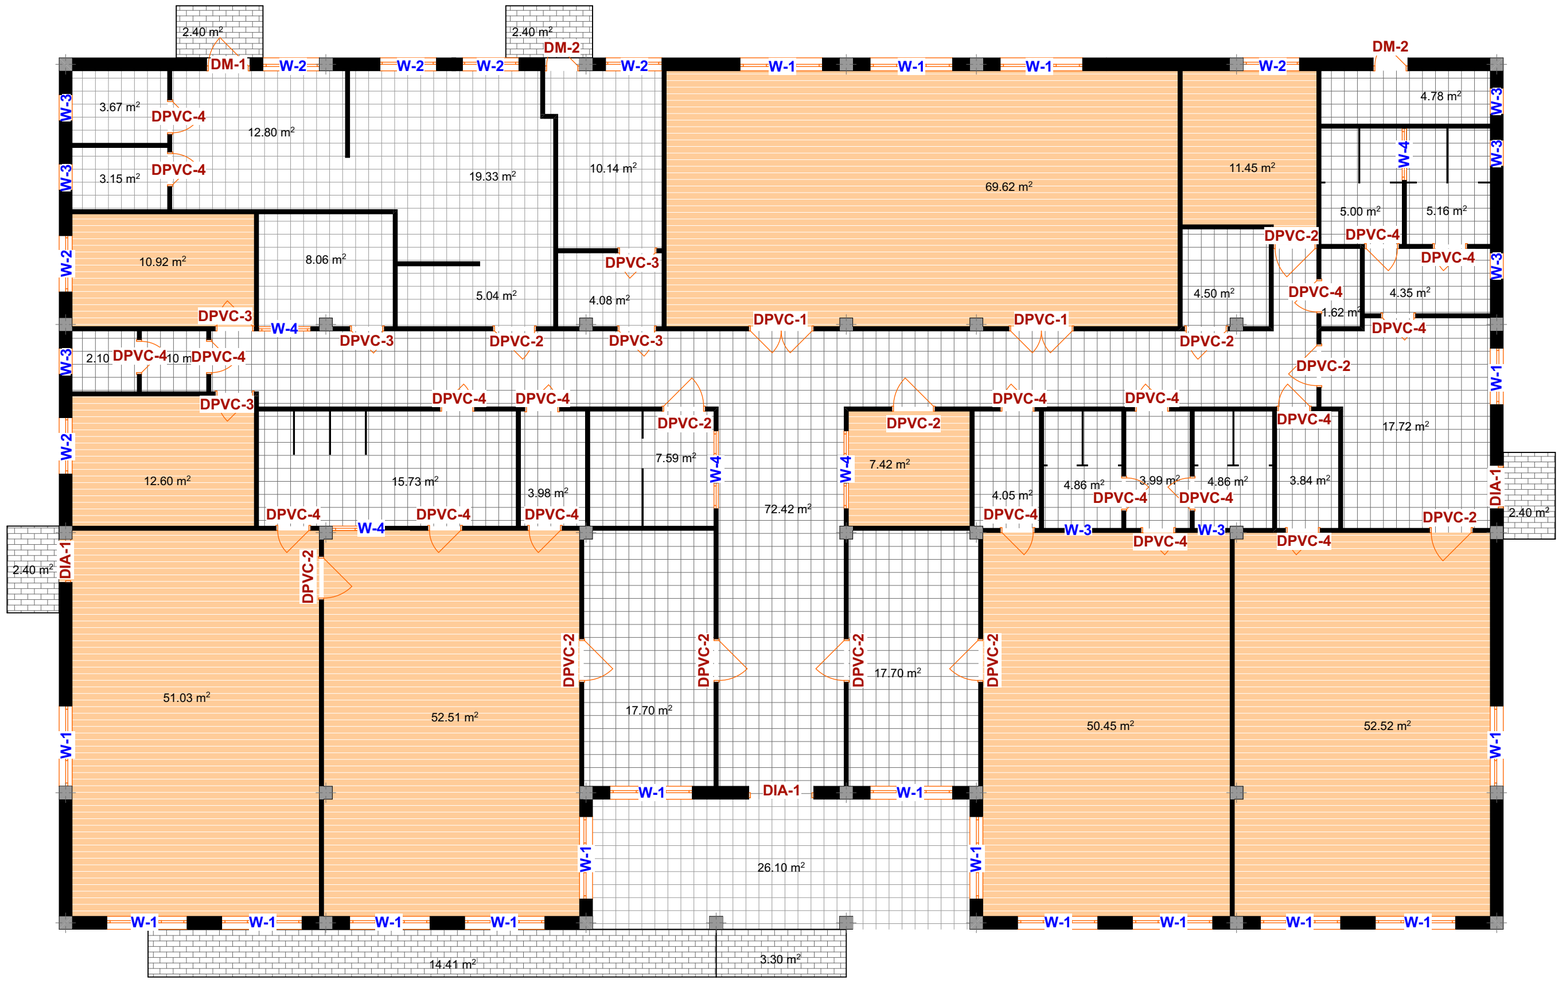

ლამინირებული პარკეტის იატაკი



კერამიკული (მეტლახის) იატაკი



ბაზალტის იატაკი



ჭერის კონსტრუქცია

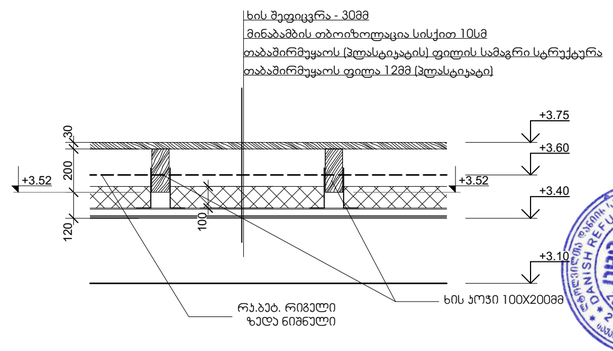

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

იატაკების და
კარ-ფანჯრების
ტიპები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
21	28

მეტალოპლასტმასის ფანჯრები

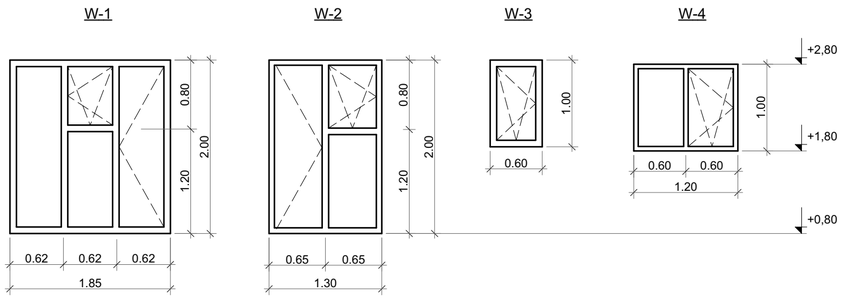

ფანჯრის ჯვანძი რაფასთან



1. რაფა
2. სამონტაჟო ქაფი
3. ორთქლსაიზოლაციო ლენტი
4. მოქნილი ანჯარი
5. საყრდენი ფიქსატორი
6. ბათქაში
7. სამაგრი დიუბელი
8. დუღაბის ფენა
9. საცრემლური
10. დამხმარე ქვესადგამი პროფილი

სპეციფიკაცია

მარკა Mark	რაოდენობა Quantity	სიგანე mm	სიმაღლე mm	m2	∑ м2
DIA-1	3	1500	2800	4.2	12.6
DM-1	1	1000	2800	2.8	2.8
DM-2	2	900	2800	2.52	5.04
DPVC-1	2	1500	2800	4.2	8.4
DPVC-2	12	1000	2800	2.8	33.6
DPVC-3	5	900	2800	2.52	12.6
DPVC-4	21	800	2800	2.24	47.04
W-1	18	1850	2000	3.7	66.6
W-2	7	1300	2000	2.6	18.2
W-3	8	600	1000	0.6	4.8
W-4	5	1200	1000	1.2	6

იზოალუმინის კარი

ფოლადის კარი ორმხრივი შემოსვით და დათბუნებით

მეტალოპლასტმასის შიგა კარები

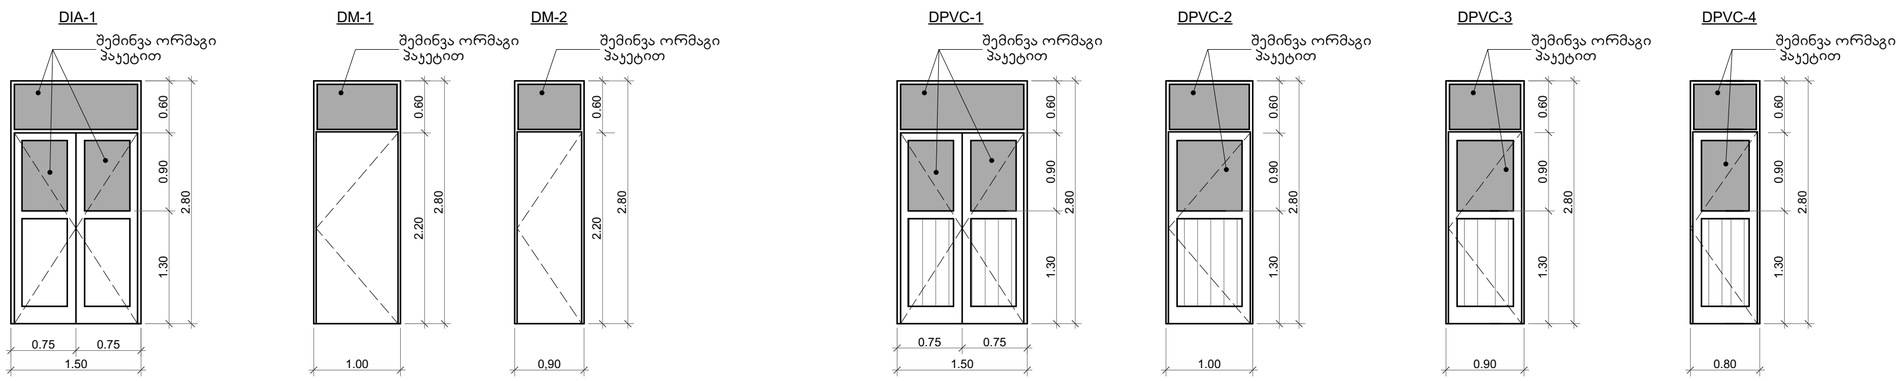

შენიშვნა:
უფროსების სანკვანძებისთვის და ადმინისტრაციის ოთახებისთვის
კარის ალათის შემინვა უნდა იყოს დაბურული

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:
საქართველო, ფოთი

Project address:
Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი
Stage: Architectural project

კარ-ფანჯრები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
22	28

ფოლადის მოაჯირი

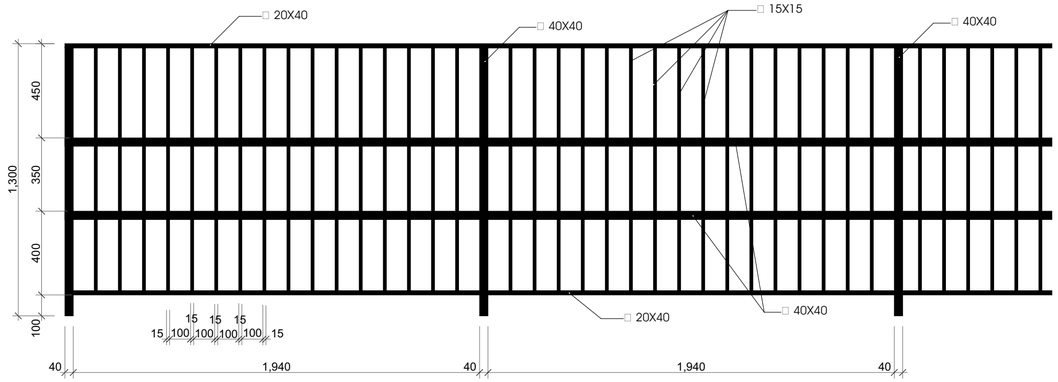

ფოლადის მოაჯირი კიბესთან

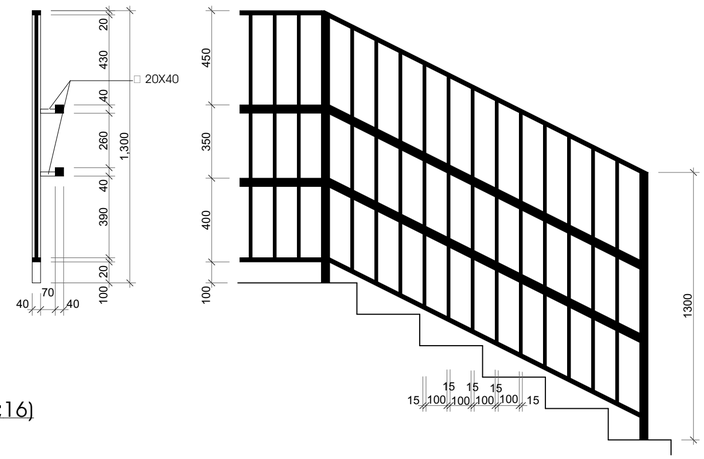

უფროსი ჯგუფის ბიჭებისა და გოგონების ტუალეტების (ოთახები 9;10;15;16) და თანამშრომელთა გასახდელის (ოთახი 27) ტიხრები

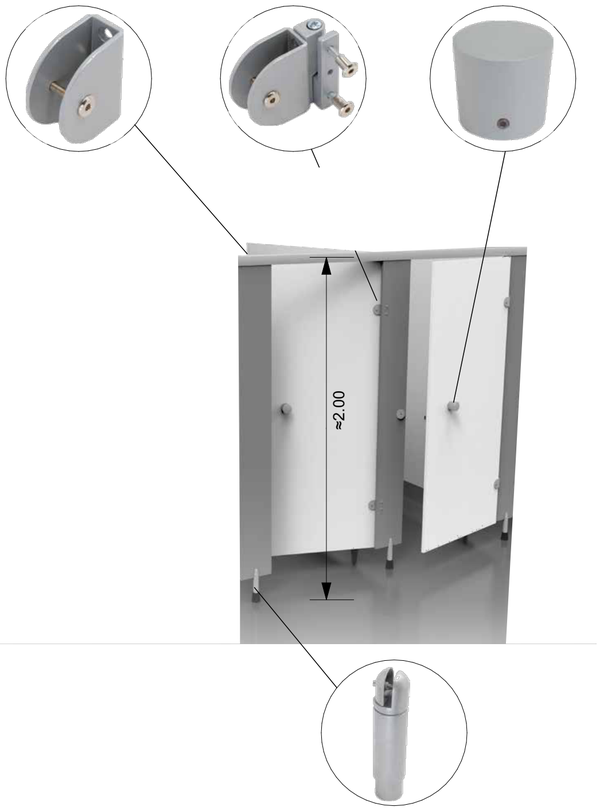

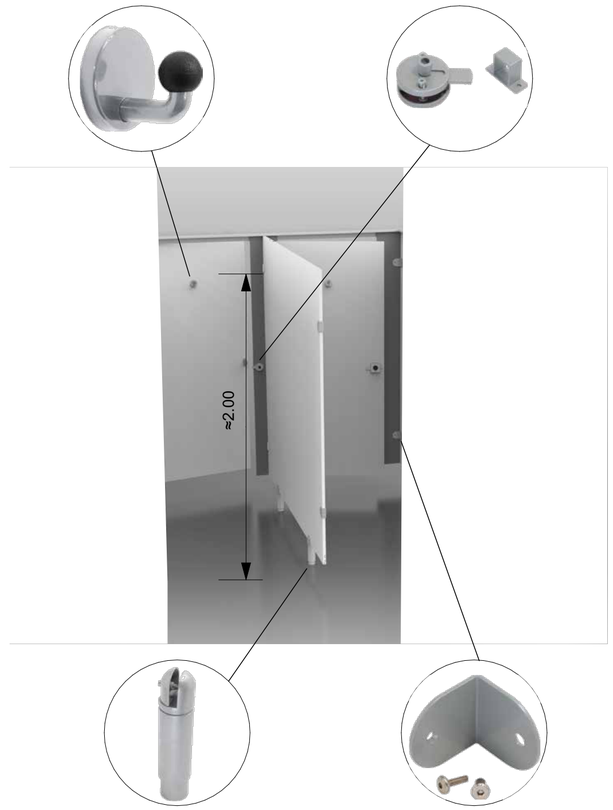

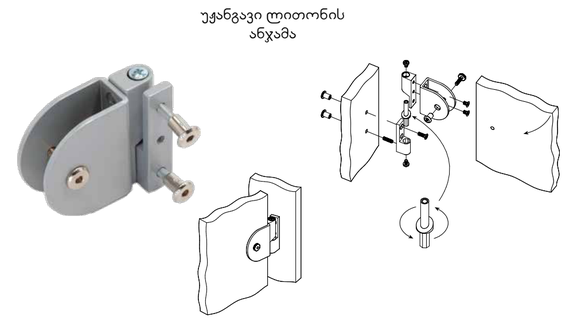

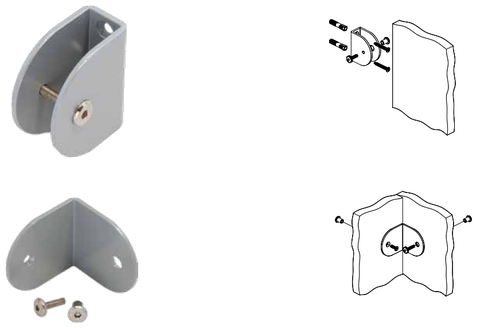



უნიტაზებს შორის შირმა მცირეწლოვანთა ჯგუფის სანჯვანძში

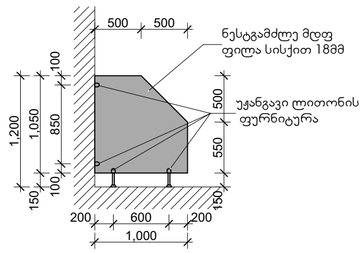

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage:
Architectural project

მოაჯირები

ტუალეტების ტიხრები

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
23	28

სათავსების ტექნოლოგიური სქემა

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სათავსების ტექნოლოგიური სქემა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
24	28

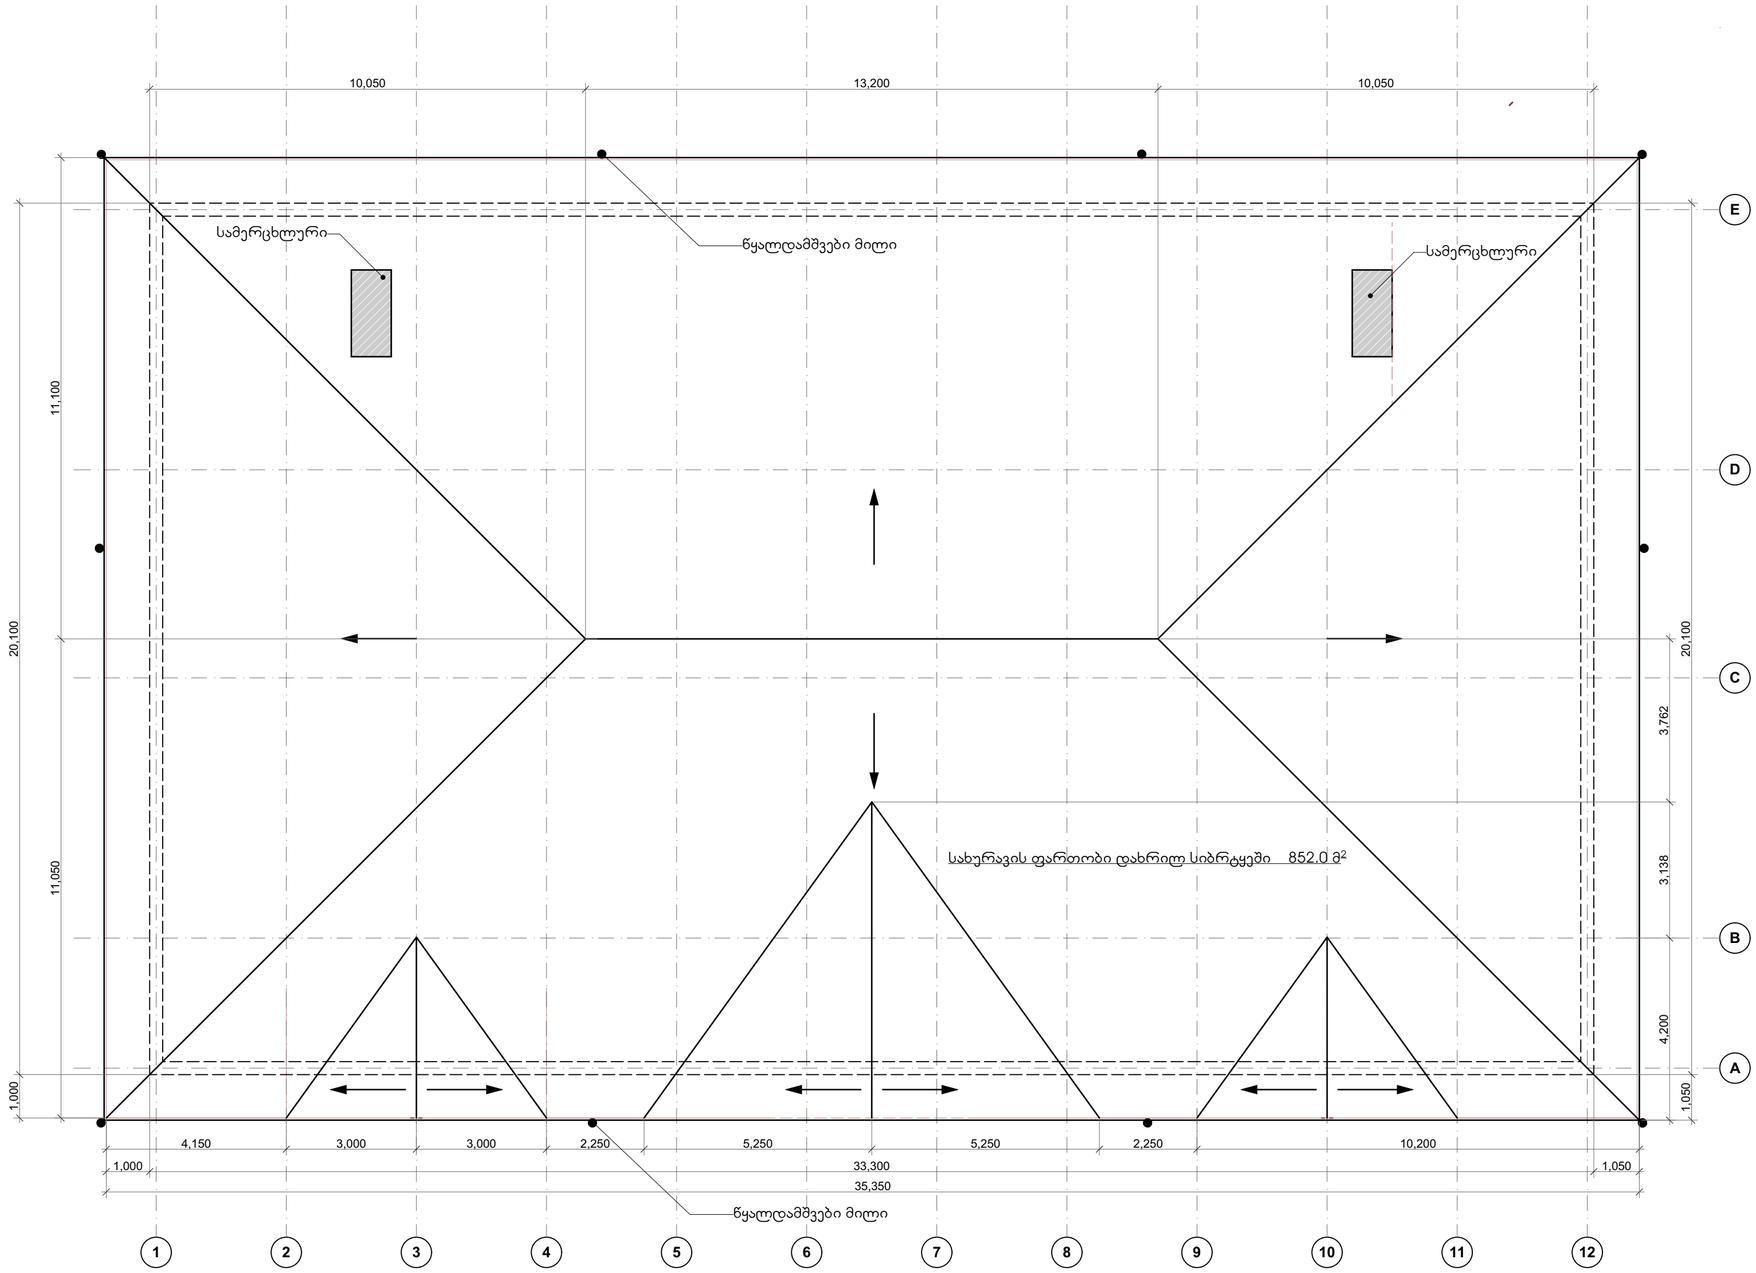

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

სახურავის გეგმა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
25	28

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ და სამშენებლო ნორმებისა და წესების ს.ნ. და წ. 3.01.01.-85 „მშენებლობის ორგანიზაციის“ გათვალისწინებით. მოპ-ის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო სამშენებლო დოკუმენტების პროექტი. ობიექტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მონაცემები.

მშენებლობის დაწყება დასაშვებია მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ. მშენებლობა უნდა მიმდინარეობდეს ტექნოლოგიური ციკლების დაცვით ყალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. დაუშვებელია დამტკიცებული სპროექტო დოკუმენტაციის გადაწყვეტილებებიდან გადახვევა, პროექტში შესატანი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორებთან.

მშენებლობაზე ყველა დროებითი ელექტრული დანადგარისა და ქსელის მოწყობა უნდა შესრულდეს მოქმედი ელექტრო ტექნიკური წესებისა და ნორმების, აგრეთვე უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით.

მშენებლობის პირობები და ობიექტის დახასიათება

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება.

საქართველოს მთელი ტერიტორიის სეისმურად აქტიურ ზონაში მდებარეობის გამო სამშენებლო ნორმები და წესები - „სეისმიმედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09) ვრცელდება მთელ მის ტერიტორიაზე, როგორც ახალმშენებარე, ასევე სარეკონსტრუქციო, გასაძლიერებელი და აღსადგენი საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაპროექტებაზე. ს.ნ და წ. -გამოყენება უნდა მოხდეს სამშენებლო დარგში სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთობლიობაში.

მშენებლობის დროს დაცული უნდა იქნეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და წესების მოთხოვნები.

სამშენებლო მოედანი წარმოადგენს მარკუთხა ფორმის მიწის ნაკვეთს, რომელსაც ესაზღვრება როგორც საზოგადოებრივი ზონები (ქუჩების მხრიდან), ასევე მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები.

პროექტი ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთზე საბავშვო ბაღის შენობის განთავსებას მთავარი ფასადით საზოგადოებრივი ზონისკენ (ქუჩისკენ), მთავარი შემოსასვლელი მოეწყობა ამ მხარეს. ასევე გათვალისწინებულია ეზოს კეთილმოწყობა-გამწვანება და შემოღობვა.

შენობის გეგმარებითი გადაწყვეტა ითვალისწინებს მასში საბავშვო ბაღის სამი ჯგუფის განთავსებას, ერთ მათგანს ექნება საძინებელი ბლოკი, ხოლო ორს, განკუთვნილს უფროსი ასაკის სკოლამდელთათვის, ასეთი ბლოკი არ გააჩნია, ამ ჯგუფში სანკვანძებში გოგონების და ბიჭების ტუალეტები განცალკევებულია.

პროექტში წარმოდგენილი შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ქვის ნაგებობს, რომლის სართულის იატაკის დონე მიწისპირიდან (სარინელის ჩათვლით) აწეულია საშუალოდ 1.0 მეტრით.

შენობის სართულის სიმაღლე იატაკიდან ჭერამდე შეადგენს 3.4 მეტრს.

გარე კედლების შვესება შესრულებულია არმირებული წყობით მცირე საკედლე პემზობლოკისაგან სისქით 30სმ.

შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს კომბლექსური რკინაბეტონის კარკასი, რკინაბეტონის სვეტების, მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების და რკინაბეტონის საძირკვლისაგან შედგენილი ჩარჩოვანი სტრუქტურა, გარე კედლებზე რკინაბეტონის სვეტების დაბეტონება შესაძლებელია კედლების ამოყვანის პარალელურად.

ტიხრები შესრულებულია არმირებული მცირე საკედლე პემზობლოკის წყობისაგან სისქით 10 სმ.

იატაკები სველ წერტილებში სრულდება მეტლახისაგან, ხოლო ოთახებში ხის ფიცრებისაგან (გემბანური). იატაკის დათბუნება სრულდება XPS ფილებით, ხოლო ჭერის დათბუნება მინაბამბით.

სანკვანძისა და სამზარეულოს შეკიდული ჭერი ეწყობა პლასტიკატისგან, ხოლო ოთახებში თაბაშირმუყაოსაგან.

სახერავის მზიდი სტრუქტურა ხისაა, ხოლო სახერავის ფენილი შეღებილი მეტალოკრამიტის.

ფანჯრები შესრულებულია მეტალოპლასტმასის პროფილებისგან ორმაგი შემინვით.

შესასვლელი კარები შესრულებულია ფოლადისა და იზოალუმინისგან, სანკვანძებში მეტალოპლასტმასისაგან, ხოლო ოთახებში ხისაგან (ე. წ. მდფ).

გარე კიბეები და ბაქნები მოპირკეთდება ბაზალტის ფილებით.

შენობის ირგვლივ ეწყობა ბეტონის სარინელი

შენობაში ეწყობა ელმომარაგების, კანალიზაციისა და წყალმომარაგების, ასევე გათბობის შიდა ქსელები რომელთა მიერთებაც მოხდება გარე საუბნო მაგისტრალურ ქსელებთან.

<u>შენობის ტექნიკური მაჩვენებლები:</u>
შენობის სართულიანობა - 1 სართული
შენობის მოცულობა - 5013.0 $მ^3$
მათ შორის: მიწის ზედა - 4058.0 $მ^3$
მიწის ქვედა - 1055.0 $მ^3$
საერთო ფართი -627.84 $მ^2$

მშენებლობის დაწყებამდე სამშენებლო მოედანი საკადასტრო საზღვრის ფარგლებში უნდა შემოისაზღვროს დროებითი ღობით. ზედაპირული წყლების ჭიჭაზე გადასაყვანად ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ითვალისწინებს ეზოს ნაწილში ნაყარის მოწყობას ბალასტით, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია ბეტონის შემომსაზღვრელი კედელი, რომელზეც შემდეგ მოეწყობა ლითონის პანელური ღობე.

მზა ბეტონის მიწოდება უნდა მოხდეს ბეტონტუმბოს საშუალებით, რომლის დგომაც შესაძლებელია ეზოს შიგა სივრცეში ტერიტორიის ჩრდილოეთ ასევე სამხრეთ ნაწილში.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების გათვალისწინებით შენობა მიეკუთვნება მე-3 კლასს.

მშენებლობის ვადები და ეტაპები

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება შენობის დანიშნულების, სართულიანობისა და გამოყენებული მასალების შესაბამისად ს.ნ და წ. 1.04.03-85-ის გათვალისწინებით. 8-9 ბალიან სეისმურ რაიონებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტებისათვის სეისმურობის კოეფიციენტი აიღება K= 1,15.

მშენებლობის ვადები განისაზღვრა რეალური მატერიალურ-ტექნიკური პირობებისა და შეასძლებლობების გათვალისწინებით.

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 12 თვით, მათ შორის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის 1 თვე.

მოსამზადებელი სამუშაოები შედგება ორი ეტაპისაგან:

1. მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ტერიტორიაზე არსებული ნაგვისა და სამშენებლო მყარი ნარჩენების გატანს, ტერიტორიაზე ბალასტის ყრილის მოწყობას, მის დატკეპნას და ამის შემდეგ სამშენებლო მოედნის შემოღობვას.
2. შენობის დაკვალვა და ძირითადი ღერძების გატანა-მონიშვნა.

მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს როგორც ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, ისე სამშენებლო მოედნის გარე და შიგა სამუშაოებს.
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების თანმიმდევრობა:

1) მიწის და შენობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები.
2) შენობის საძირკვლის და ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე.
3) შენობის სართულის ძირითადი მზიდი და არამზიდი კონსტრუქციების მონტაჟი.
4) შენობის სახურავის მონტაჟი.
5) კარ-ფანჯრების მონტაჟი.
6) შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.
7) შენობის შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (პარალელურად, ელსამონტაჟო და სხვა საინჟინრო ქსელების, კერძოდ წყალსადენი და კანალიზაცია, გათბობის შისტემა მოწყობა).
8) კეთილმოწყობის სამუშაოები.

სამშენებლო მოედნის ორგანიზება და მშენებლობის უსაფრთხოების წესები

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. სამშენებლო მოედნის საზღვრები, როგორც წესი, უნდა მოეკვეთოს მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში.

ბალასტის ყრილის მოწყობის შემდეგ წარმოებს სამშენებლო მოედნის შემოღობვა და დროებითი შენობების განლაგება, მიწის სამუშაოების დაწყებამდე წარმოებს შენობის ღერძების დაკვალვა და მათი მონიშვნა-გატანა შენობის პერიმეტრიდან.

სამშენებლო მოედანზე უნდა განთავსდეს საზოგადოებრივი სივრცეებიდან აღქმადი საინფორმაციო ბანერი.

სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული ისე, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება საქართველოს მთავრობის №6228.03.07 დადგენილების, ასევე „მშენებლობის უსაფრთხოების წესების“ და ს.ნ. და წ III-4-80 მიხედვით.

მშენებლობის უსაფრთხოების წესები ვრცელდება მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებულ ობიექტზე შესასრულებელ სამუშაოებზე და განსაზღვრავს უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამშენებლო მოედანზე: ორგანიზების, სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების ექსპლოატაციის, ელექტრო და აირსაშემდეგებლო, დატვირთვა-დაცლის, საიზოლაციო, მიწის, საძირკვლების მოწყობის, გადახურვის სამუშაოების, მიწისქვეშა სამუშაოების, ბეტონისა და რკინა-ბეტონის, სამონტაჟო, სადემონტაჟო და სხვა სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს. საჭიროა დაცულ იქნეს ყველა ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები თანახმად „ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას“ ს.ნ. და წ 2.01.02-91-ის მიხედვით.

სამშენებლო მოედანზე შესვლა უნდა გაკონტროლდეს და უნდა გამოირიცხოს იქ უნებლიე მოხვედრის შესაძლებლობა, უცხო პირთათვის. შემოღობვა ხალხის მოძრაობის ზონაში გადახურული უნდა იყოს ისეთი დამცავი საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას. სიბნელის დროს შემოღობვა უნდა იყოს აღჭურვილი სასიგნალო ნათურებით ან გამოყენებულ იქნეს ისეთი მასალა ან შეფერილობა რომელიც აღიქმება სიბნელეში. იმავე წესით უნდა შემოიღობოს სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის (დაფიქსირების შემთხვევაში) ტერიტორია.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილი უნდა იყოს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც პასუხს აგებს უსაფრთხოების წესების დაცვისათვის.

მუშებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს უნდა ეხეროთ ჩაფხუტები, ხოლო სპეციალური სამუშაოები უნდა შესრულდეს სათანადო აღჭურვილობის გამოყენებით.

სამშენებლო მოედანზე უნდა იყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

მასალების, კონსტრუქციების და სხვა მოწყობილობების დასაწყობება და განთავსება უნდა მოხდეს შესაბამისად ნორმებისა მათი ჩამოცურების, ჯდენის, ჩამოცვენის და გაშლის შესაძლებლობის გამოსარიცხად.

მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს სათავსებში. დატვირთვა-დაცლის სამუშაოთა წარმოების დროს მიღებულ უნდა იქნეს ზომები მათი გაფანტვისა და გამტვერვის თავიდან ასაცილებლად. მავნე ან აფეთქებასაშიში გამხსნელი მასალები აუცილებლად უნდა ინახებოდეს ჭერმტკლად დახურულ ტარაში.

მშენებლობაზე მომუშავეთა სამუშაო-ჰიგიენური პირობების დაცვისა და შრომის სწორი ორგანიზებისათვის სამშენებლო მოედანზე შენობის სამხრეთით გათვალისწინებულია დროებითი ნაგებობები, რომლებიც აღებულ უნდა იქნეს სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე.

ფარული სამუშაოების აქტების ჩამონათვალი

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე, შემდეგი სამუშაოს დაწყებამდე, რომელიც გამოინვევს მის დაფარვას, ადგილზე გამოკვლევის შემდეგ უნდა შედგეს ფარული სამუშაოების აქტი - მშენებლობის მწარმოებელის მიერ. ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელთა დათვალიერების შემდეგ უნდა შედგეს ფარული სამუშაოების აქტი:

- შენობის ღერძების დაკვალვა.
- საძირკვლებისათვის მოწყობილი ტრანშეის მიღება
- რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.
- რკინა-ბეტონის ჩანართების და კედლების მოწყობა მიხედვით
- საძირკვლის, სარდაფის კედლებისა და გადახურვის ჰიდროიზოლაციის დათვალიერება.
- კედლების სვეტებთან დაკავშირება.
- ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების მიღება.

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

სამშენებლო მოედანზე წარმოების პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.
გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში
იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა.
დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭაში ბეტონისა და ცემენტის ხსნარის
მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.
იკრძალება ნარჩენებისა და სამშენებლო ნაგვის გადმოყრა დახურული ღარებისა და
ბუნკერ-მუმურების გარეშე.
თუ მშენებლობის-რეკონსტრუქციის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანტვა შენობას უნდა ჩამოეფაროს ფარდა ან სამუშაოები უნდა მოეწყოს დახურულ სივრცეში.
ფხვიერი სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირების დროს ავტომანქანის ძარაში ჩაკვირთვის შემდეგ ზედაპირი უნდა დაინამოს ან დაიფაროს დამცავი საფარით. სამშენებლო მოედნიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამოსვლის წინ საჭიროა მათი საბურავების გაწმენდა, რათა ადგილი არ ქონდეს ქალაქის ქუჩების დაბინძურებას.

რეკომენდირებული სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები; სატრანსპორტო საშუალებები ინსტრუმენტები

ტექნიკური საშუალების დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოები
ექსკავატორი, ჩამჩის ტევადობით 0,2 $მ^3$	მიწის სამუშაოები
საგზაო სატკეპნი	ეზოს კეთილმოწყობა
ავტოამწე	სხვადასხვა სამუშაოები
ავტოთვითმცლელი	გრუნტის გატანა, ინერტული მასალების შემოზიდვა
ძარიანი ავტომობილი	ტვირთების შემოზიდვა
სპეციალური ავტოტრანსპორტი საწევარი მისაბმელით	არმატურის და სხვა დიდი გაბარიტის მასალის ტრანსპორტირება
გადასასანი კომპრესორი	ჰაერის მიწოდება
სიღრმითი ვიბრატორი	ბეტონის სამუშაოები
ზედაპირული ვიბრატორი	ბეტონის სამუშაოები
საშემდეგებლო აგრეგატი	შედეგების სამუშაოები
ბეტონმრევი	დეგაბის მომზადება
ბეტონის ტუმბოდანადგარი ბეტონსადენით	ბეტონის სამუშაოები
სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო-პნევმატური ინსტრუმენტი	სამშენებლო და სპეც. სამუშაოები

შენიშვნა: შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იგივე პარამეტრების თანამედროვე ტექნიკა არსებული ტექნიკური ბაზის მონაცემების გათვალისწინებით

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
<u>9 აპრილის ხეივანი №4ა</u>

<u>პროექტის მისამართი:</u>
საქართველო, ფოთი

<u>Project address:</u>
Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი
<u>Stage:</u> Architectural project

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
26	28

სამშენებლო გენგეგმა

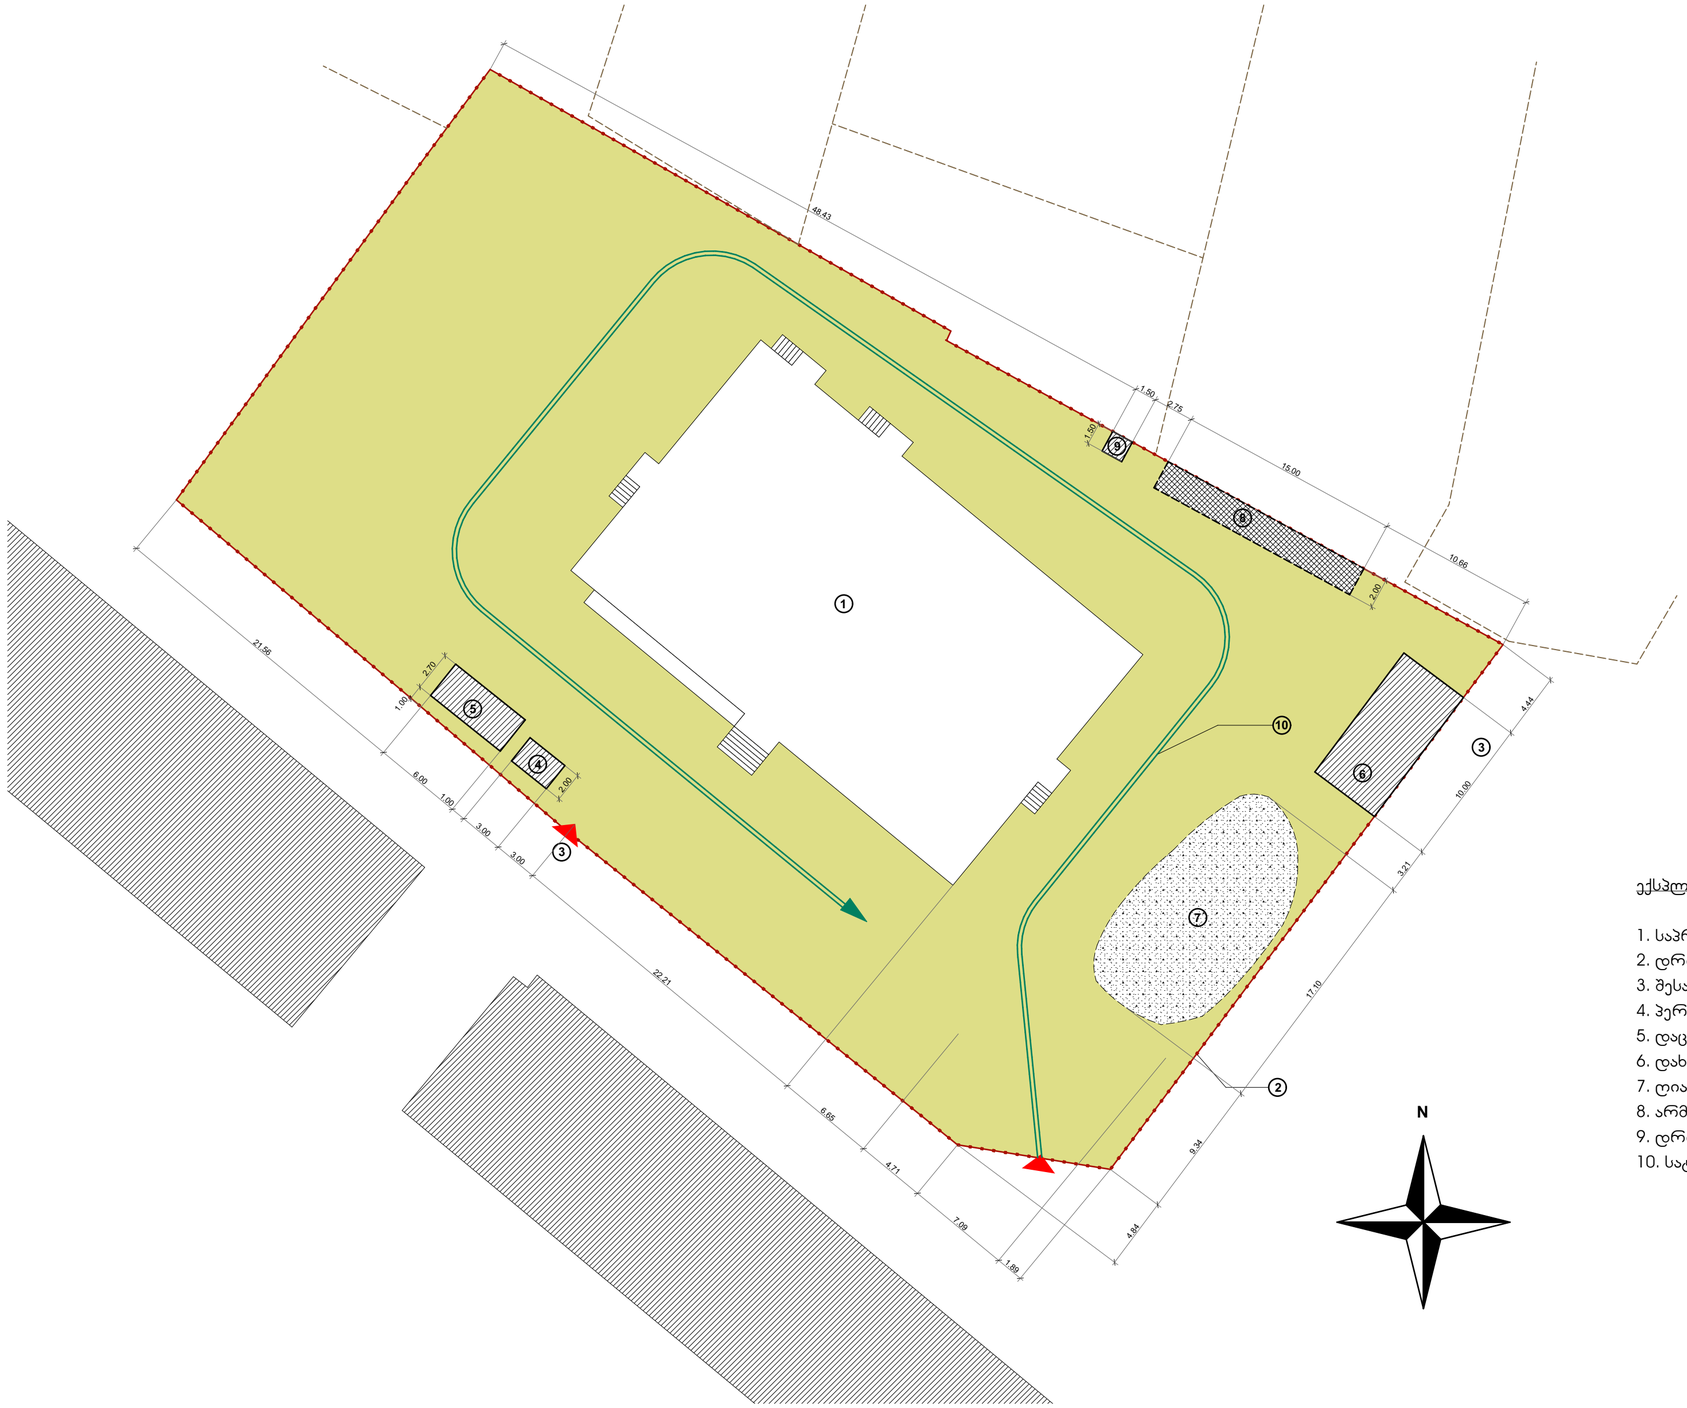

ექსპლიკაცია :

1. საპროექტო შენობა
2. დროებითი ღობე
3. შესასვლელი
4. პერსონალის სათავსი
5. დაცვის ოთახი
6. დახურული საწყობი
7. ღია საწყობი ინერტული მასალისთვის
8. არმატურის საწყობი
9. დროებითი ბიოტუალეტი
10. სატრანსპორტო საშუალების სვლაგეზი

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო ბაღი
ქალაქი ფოთი
9 აპრილის ხეივანი №4ა

პროექტის მისამართი:

საქართველო, ფოთი

Project address:

Georgia, Poti

ეტაპი: მუშა პროექტი

Stage: Architectural project

სამშენებლო გენგეგმა

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
27	28

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს აღწერილობა	12 თვე																																										
		I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	■	■	■	■	■																																						
2	ტერიტორიაზე ბალასტის ყრილის მოწყობა				■	■	■	■	■																																		
3	საძირკვლის სამუშაოები					■	■	■	■	■	■																																
4	ზეძირკვლის სამუშაოები							■	■	■	■	■																															
5	იატაკების დაბეტონება									■	■	■	■																														
6	კედლებისა და სვეტების ამოყვანა										■	■	■	■	■	■	■																										
7	რკინაბეტონის ლავგარდნისა და რიგელების დაბეტონება														■	■	■	■																										
8	შენობის გადახურვა																■	■	■	■																								
9	ჯარ-ფანჯრების მონტაჟი																	■	■	■	■																							
10	კედლების შელესვა																	■	■	■	■	■	■																				
11	მოპირკეთებითი სამუშაოები																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
12	ელ-სამონტაჟო სამუშაოები			■	■									■	■	■									■	■	■	■										■					
13	სან-ტექნიკური სამუშაოები			■	■											■	■	■							■	■	■	■										■					
14	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები			■	■							■	■	■									■	■	■	■	■	■							■	■	■						
15	ტერიტორიის დასუფთავება																										■	■															■

DANISH REFUGEE COUNCIL

ლტოლვილთა
დანიის საბჭო

Danish Refugee Council

ტიპიური საბავშვო
ბაღი
ქალაქი ფოთი

9 აპრილის ხეივანი
№4ა

პროექტის
მისამართი:

საქართველო,
ფოთი

Project address:

Georgia,
Poti

ეტაპი:
მუშა
პროექტი

Stage:
Architectural project

მშენებლობის
კალენდარული
გრაფიკი

ბ. ქანთარია
B. Qantaria

ა. გერგედავა
A. Gergedava

ფორმატი
Format A - 2

ფურცელი Page	ფურცლები Pages
28	28
